

**UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS**  
CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS  
INTERNACIONALES



**TESIS:**

**“Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”**

**PRESENTADO POR:**

Bach. HUAMÁN QUISPE, PAULINO

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:**

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

**ASESOR:**

Mg. URIBE TAPAHUASCO, JUAN JOSE

**ORCID:** [0000-0003-2452-1524](https://orcid.org/0000-0003-2452-1524)

**DNI: 28237618**

**LIMA-PERÚ**

**2023**



**INFORME DE SIMILITUD N°009-2023-UPCI-FCEYN-REHO-T**

**A** : **MG. HERMOZA OCHANTE RUBÉN EDGAR**  
Decano (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios

**DE** : **MG. HERMOZA OCHANTE, RUBEN EDGAR**  
Docente Operador del Programa Turnitin

**ASUNTO** : Informe de evaluación de Similitud de Tesis:  
**BACHILLER HUAMAN QUISPE, PAULINO**

**FECHA** : Lima, 15 de enero de 2023.

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de informar lo siguiente:

1. Mediante el uso del programa informático **Turnitin** (con las configuraciones de excluir citas, excluir bibliografía y excluir oraciones con cadenas menores a 15 palabras) se ha analizado la Tesis titulada: **“Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”**, presentado por el Bachiller **HUAMAN QUISPE, PAULINO**.
2. Los resultados de la evaluación concluyen que la Tesis en mención tiene un **ÍNDICE DE SIMILITUD DE 27%** (cumpliendo con el artículo 35 del Reglamento de Grado de Bachiller y Título Profesional UPCI aprobado con Resolución N° 373-2019-UPCI-R de fecha 22/08/2019).
3. Al término análisis, el Bachiller en mención **PUEDEN CONTINUAR** su trámite ante la facultad, por lo que el resultado del análisis se adjunta para los efectos consiguientes

Es cuanto hago de conocimiento para los fines que se sirva determinar.

Atentamente,

  
-----  
**MG. HERMOZA OCHANTE, RUBEN EDGAR**  
Universidad Peruana de Ciencias e Informática  
Docente Operador del Programa Turnitin

Adjunto:

- \*Recibo digital turnitin
- \*Resultado de similitud

## **DEDICATORIA**

A Dios, el ser que me creo y me dio la oportunidad de conocer bellas personas y aportar mediante este trabajo para el desarrollo del conocimiento.

A mi familia, y en especial a mi querida esposa Susana, por ser el motor y motivo de mi trabajo y esfuerzo continuo.

A la memoria de mis padres Cesar y Eulogia, ellos quizás poco tiempo me acompañaron y me enseñaron para ser una persona del bien, para esforzarme con voluntad y lograr el objetivo, sin fronteras de tiempo, ni espacio.

A mis hijos Enver y Mariluz, las personas que me acompañan día a día, ellos mis fortalezas para continuar el desarrollo personal.

A todos mis familiares y los amigos son las personas quienes me apoyaron con un granito de arena aportaron de manera directa e indirecta a la realización del presente trabajo académico y reto personal.

## **AGRADECIMIENTO**

En primero lugar quiero agradecer a mi tutor asesor, quien con sus conocimientos y apoyo me orientó a través de cada una de las etapas de este proyecto para alcanzar los resultados que buscaba.

También quiero agradecer a la Municipalidad provincial de Huanta, por brindarme todos los recursos y herramientas que fueron necesario para llevar adelante el proceso de investigación. No hubiera obtenido arribar a estos resultados de no haber sido por su incondicional ayuda.

Por último, quiero agradecer a todos mis compañeros y a mi familia, por apoyarme aun cuando mis ánimos decaían. En especial, quiero hacer mención abrazo reconfortante para renovar energías en mi vida

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	II
AGRADECIMIENTO .....	III
ÍNDICE.....	IV
ÍNDICE DE TABLAS.....	VII
RESUMEN .....	IX
ABSTRACT.....	XI
I. INTRODUCCIÓN.....	13
1.1. Realidad problemática.....	13
1.2. Planeamiento del problema.....	17
1.2.1. Problema general.....	17
1.2.2. Problemas específicos.....	18
1.3. Objetivos de la investigación.....	18
1.3.1. Objetivos generales.....	18
1.3.2. Objetivos específicos.....	18
1.4. Hipótesis de la investigación.....	18
1.4.1. Hipótesis general.....	18
1.4.2. Hipótesis específicas.....	19
1.5. Variables, dimensiones e indicadores.....	19
1.6. Variables, dimensiones e indicadores.....	20
1.7. Justificación del estudio.....	21
1.7.1. Justificación teórica.....	21
1.7.2. Justificación practica.....	21
1.7.3. Justificación metodológica.....	22
1.8. Antecedentes internacionales y nacional.....	23
1.8.1. Antecedentes Internacionales.....	23

1.8.2. Antecedentes Nacional .....	27
1.9. Marco teórico .....	32
1.9.1. Conceptos de Ejecución de proyectos de inversión .....	32
1.9.2. Características .....	50
1.9.3. Teorías .....	53
1.9.4. Conceptos el cumplimiento de metas .....	54
1.9.5. Características .....	55
1.9.6. Teorías .....	60
1.10. Definición de términos básicos.....	62
II. METODO .....	65
2.1 Tipo y diseño de investigación .....	65
<b>2.1.1. Tipos de investigación</b> .....	65
<b>2.1.2. Nivel de investigación</b> .....	65
<b>2.1.3. Método y Diseño de investigación</b> .....	65
<b>2.1.4. Diseño de investigación</b> .....	66
2.2 Población y muestra .....	66
<b>2.2.1 Población</b> .....	66
<b>2.2.2 Muestra</b> .....	67
2.3 Técnicas para la recolección de Información.....	68
2.4 Validez del instrumento cualitativo .....	68
<b>2.4.1 Validez de los instrumentos</b> .....	69
<b>2.4.2 Confiabilidad de los instrumentos</b> .....	69
2.5 Procesamiento y análisis de la información.....	69
<b>2.5.1 Procesamiento</b> .....	70
<b>2.5.2 Análisis de la información</b> .....	70
2.6 Aspectos éticos.....	70
III. RESULTADOS .....	71
3.1 Resultados descriptivos .....	71
IV. DISCUSIÓN.....	92

V.	CONCLUSIONES .....	93
VI.	RECOMENDACIONES .....	95
	REFERENCIAS BIBIOGRAFICAS .....	96
	ANEXOS.....	99
	Anexo 1. Matriz de consistencia.....	100
	Anexo 2. instrumento de recolección de datos.....	103
	Anexo 3. Base de datos .....	106
	Anexo 4. Evidencias de similitud digital .....	110
	Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio .....	115
	Anexo 6. Juicio de expertos .....	116

## ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1</i>	<i>Operacionalización de las variables</i> .....	20
<i>Tabla 2</i>	<i>Ejecución Presupuestal por Distrito de la Provincia de Huanta</i> .....	34
<i>Tabla 3</i>	<i>Proyectos de Inversion PMI 2019</i> .....	37
<i>Tabla 4</i>	<i>Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento</i> .....	57
<i>Tabla 5</i>	<i>Población que se tomará en cuenta para la investigación</i> .....	67
<i>Tabla 6</i>	<i>Proyectos de Inversion PMI 2019</i> .....	75
<i>Tabla 7</i>	<i>avance ejecución proyectos de inversión PMI 2019</i> .....	77

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	<i>Presupuesto y ejecución</i> .....	36
Figura 2	<i>Ejecución de presupuesto por producto</i> .....	50
Figura 3	<i>los actores involucrado MEF y sus funciones</i> .....	59
Figura 4	<i>entidades públicas responsables de Meta y sus funciones</i> .....	59
Figura 5	<i>Municipalidad involucrado y sus funciones</i> .....	60
Figura 6	<i>Clasificación de las municipalidades</i> .....	60
Figura 7	<i>Procedimientos de normativas</i> .....	61
Figura 8	<i>Cronograma de procedimiento normativo</i> .....	61
Figura 9	<i>Avance de ejecución presupuestal 2019.</i> .....	73
Figura 10	<i>Programación multianual de inversión-PMI</i> .....	75

## RESUMEN

El trabajo de investigación titulado: “Ejecución de los Proyectos de Inversión y el Cumplimiento de Metas en el Marco del Programa de Incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019”. La Municipalidad Provincial de Huanta es una persona jurídica con derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y objetivos. El problema radica en que no se efectúa de manera acertada la ejecución Presupuestaria, dentro del marco de su competencia y funciones específicas, por lo que se refleja en algunas deficiencias con respecto a la ejecución de proyectos de inversión y gastos no cumpliéndose con lo programado, lo cual afecta al logro de objetivos y cumplimiento de metas del programa de incentivo municipal; El objetivo de la investigación fue: Evaluar la “Ejecución de los Proyectos de Inversión y el Cumplimiento de Metas en el Marco del Programa de Incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019”; La metodología aplicada para su desarrollo estuvo enmarcado a los métodos descriptivo y deductivo, los que nos permitieron establecer nuestras conclusiones de la investigación: El presupuesto de gastos programado para el periodo 2019, el presupuesto de inversión según PIA fue de S/. 9,871,094, PIM fue de S/. 46,084,526, y tuvo una ejecución en el año fiscal del 2019, la Municipalidad provincial de Huanta, ha ejecutado el presupuesto de inversión solo hasta la S/. 26,112,051, el porcentaje que representa al 56.7 % del total del PIM 2019, el presente trabajo de investigación realiza el análisis correspondiente, cuáles han sido el motivo para no ejecutar al 80% o al 100% los presupuesto programadas para el año fiscal 2019, en el cumplimiento de la meta en el marco del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal, asimismo el periodo 2018, que indica un menor grado de

ejecución de Gastos respecto al PIM fue de S/. 39,877,307. la ejecución de los proyectos de inversión es S/. 14,373,081, que representa al 36 %, así que en ambos periodos hubo una deficiente capacidad de gasto que incidió negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de incentivo municipal.

**Palabras clave:** “Ejecución de los Proyectos de Inversión y el Cumplimiento de Metas en el Marco del Programa de Incentivo.

## ABSTRACT

The research work entitled: "Execution of Investment Projects and the Fulfillment of Goals in the Framework of the Incentive Program in the Provincial Municipality of Huanta 2019". The Provincial Municipality of Huanta is a legal entity with public law and full capacity to fulfill its aims and objectives. The problem is that the Budget execution is not carried out correctly, within the framework of its competence and specific functions, which is reflected in some deficiencies with respect to the execution of investment projects and expenses, not complying with what programmed, which affects the achievement of objectives and fulfillment of the goals of the municipal incentive program; The objective of the research was: Evaluate the "Execution of Investment Projects and the Fulfillment of Goals in the Framework of the Incentive Program in the Provincial Municipality of Huanta 2019"; The methodology applied for its development was framed by the descriptive and deductive methods, which allowed us to establish our research conclusions: The expense budget programmed for the 2019 period, the investment budget according to PIA was S /. 9,871,094, PIM was S /. 46,084,526, and had an execution in fiscal year 2019, the provincial Municipality of Huanta, has executed the investment budget only up to S /. 26,112,051, the percentage that represents 56.7% of the total PIM 2019, this research work performs the corresponding analysis, what have been the reason for not executing 80% or 100% of the budgets programmed for fiscal year 2019, in The fulfillment of the goal within the framework of the Incentive Program for the Improvement of Municipal Management, also the 2018 period, which indicates a lower degree of execution of

Expenditures compared to the PIM was S / . . execution in investment projects is.... which represents a%, so in both periods there was a deficient spending capacity that had a negative impact on the fulfillment of the objectives and goals of the municipal incentive program.

**Keywords:** “Execution of Investment Projects and the Fulfillment of Goals in the Framework of the Incentive Program.

## I. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Realidad problemática

En la actualidad todos los gobiernos locales tiene el objetivo de buscar para mejorar las condiciones de vida de la población, para lo cual los recursos asignan de los fondos públicos, a las instituciones descentralizadas como gobiernos regionales y locales, para ejecución de proyectos de inversión, en los países de Europa, la ejecución de proyectos de inversión, el avance de ejecución presupuestal en las obras publicas es mayor al 80% y el cumplimientos de metas por su puesto es más alto y beneficioso para la población, mientras en los países de América Latina la ejecución de proyectos de inversión pública es Baja casi menos de 60% en diferentes organismos públicos .

El problema en el Perú es débil capacidad para el planeamiento de proyectos de inversión y falta de información estadística sobre las brechas impiden programar estratégicamente las inversiones. La mayoría de Gobiernos descentralizados cumplen con elaborar sus Planes de Desarrollo Concertado (PDC), Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Presupuestos Participativos (PP). No obstante, la calidad de los documentos presenta algunas limitaciones. Menos del 17% de los PDC y PEI elaborados por los Gobiernos

Regionales cumplen con el periodo de vigencia exigido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Asimismo, el 94% de las Municipalidades Provinciales y el 77% de las Municipalidades Distritales manifestaron requerir apoyo técnico para mejorar sus capacidades en la elaboración de sus PDC.

De otro lado, la ausencia de información estadística confiable y representativa respecto a las brechas de calidad y cobertura de los servicios públicos a nivel Provincial y Distrital, da lugar a que los instrumentos de planeamiento y los perfiles de los proyectos de inversión pública (PIP) sean elaborados en base a información desactualizada e incompleta. Sin cálculos de brechas a nivel descentralizado y líneas base, no es posible programar estratégicamente las inversiones ni determinar las prioridades, para posteriormente efectuar el seguimiento y monitoreo del impacto de la inversión.

La “ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”, no han sido cumplidas la meta 1; “Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado”, hasta el 31 de diciembre de 2019. Durante el año 2019, son varios proyectos que han sido programado con diferentes recursos transferidos por el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía finanzas.

Según la (Ley N°. 30879, 2018), “*LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019*”, correspondiente a los gobiernos locales son los fondos transferidos como, gastos corrientes, gastos de capital y servicios de la deuda, la programación presupuestal se realizan a través de participativo, un año anterior, aprobando a través por los miembros del CCL, para los diferentes proyectos de inversión pública, con la programación “Presupuesto Institucional de Apertura-PIA”, y al inicios del primer trimestre

del año 2019, realizan la reprogramación en el “Presupuesto Institucional Modificado-PIM, acuerdo a la priorización de proyectos.

El presupuesto público, es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.

El PI se creó en el año 2009 mediante Ley N° 29332 y modificatorias, y entró en operatividad en el año 2010. Es una herramienta de Incentivos Presupuestarios vinculado al Presupuesto por Resultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que promueve la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional, implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas del Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con las municipalidades.

Con la implementación del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones (Invierte.pe), se busca revertir esta situación mediante la mejora de la calidad de la inversión pública, dándole prioridad a la selección de carteras de inversiones orientadas al cierre de brechas en particular, así como introduciendo eficiencia en los procesos de inversión pública, en general. En ese sentido, la mayor eficiencia e incremento del nivel de ejecución presupuestal de inversiones permitirá no solo aumentar la disponibilidad de activos

públicos que provean servicios prioritarios para la población, sino también, permitirá reducir los altos costos de transacción que restringen todo el potencial de beneficios sociales que se puede obtener de la ejecución de la inversión pública. De esta forma, se garantiza que un mayor impulso fiscal, mediante el gasto en inversión pública, surta un efecto positivo y sostenible sobre la economía.

En tal sentido, la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal, busca promover en las Municipalidades provinciales pertenecientes a ciudades principales tipo A, Municipalidades provinciales no pertenecientes a ciudades principales tipo B, Municipalidades distritales de Lima Metropolitana Tipo C, Municipalidades distritales de otras ciudades principales tipo D, Municipalidades distritales no consideradas ciudades principales y al menos 60% de población urbana, tipo E, Municipalidades distritales no consideradas ciudades principales, al menos 30% y menos de 60% de población urbana, tipo F, Municipalidades distritales no consideradas ciudades principales con menos de 30% de población urbana, tipo G, una mayor y mejor ejecución del gasto

destinado a inversiones que cierren brechas de acceso a servicios públicos prioritarios.

La meta 1 permitirá que las municipalidades satisfagan las necesidades básicas de los ciudadanos y promuevan el desarrollo sostenible de sus territorios, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

En tal sentido la municipalidad provincial de Huanta debería cumplir con la meta 1: “Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado”, hasta el 31 de diciembre de 2019. En el marco del programa de incentivo municipal, alcanzando el puntaje máximo de 100 puntos, para ello, la municipalidad provincial de Huanta ha programado el presupuesto de inversión en PIA la S/. 9,871,094, PIM la S/. 46,084,526, que debería alcanzar el puntaje mínimo de 80 puntos, ejecutando al 85% del presupuesto total del PIM.

En el año fiscal del 2019 la Municipalidad provincial de Huanta, ha ejecutado su presupuesto de inversión solamente la S/. 26,112,051, el porcentaje ejecutada al 56.7 % del total del PIM. Justamente el presente trabajo de investigación realiza el análisis correspondiente, cuáles han sido el motivo para no ejecutar al 80% o 100% los presupuesto programadas para el año fiscal 2019, en el cumplimiento de la meta en el marco del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal. La información obtenida en consulta amigable del año 2019, en la plataforma de solo proyectos en el siguiente enlace.

## **1.2. Planeamiento del problema**

### **1.2.1. Problema general**

¿Cuáles el nivel de “Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”?

### 1.2.2. Problemas específicos

¿Cuáles el nivel de ejecución de los proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019?

¿Cuáles el nivel de cumplimiento de la meta del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019?

¿Cuáles la relación que existe entre la ejecución de proyectos de inversión y cumplimiento metas del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019?

## 1.3. Objetivos de la investigación

### 1.3.1. Objetivos generales

Establecer el nivel de “Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”.

### 1.3.2. Objetivos específicos

Establecer el nivel ejecución de los proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019.

Establecer la relación que existe entre el nivel de cumplimiento de metas del programa incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019.

Construir la capacidad de ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo municipal de la Municipalidad Provincial de Huanta 2019.

## 1.4. Hipótesis de la investigación

### 1.4.1. Hipótesis general

Existe significativamente el nivel de “Ejecución de los proyectos de inversión y el

cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”.

#### 1.4.2. Hipótesis específicas

Existe el nivel de ejecución de proyectos de inversión en la Municipalidad provincial de Huanta, 2019.

Existen la relación entre el nivel de cumplimiento de la meta del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019.

Existe la relación y la capacidad en el nivel de ejecución de proyecto de inversión y el cumplimiento de meta en el marco del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019.

### **1.5. Variables, dimensiones e indicadores**

#### **Variables independientes**

- Ejecución de los proyectos de inversión

#### **Variables dependientes**

- Cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo municipal

## 1.6. Variables, dimensiones e indicadores

**Tabla 1 Operacionalización de las variables**

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
Ejecución de los proyectos de inversión	Según <i>invierte.pe</i> , la ejecución de proyectos de inversiones tiene ciclos de programación multianual de inversiones a través de su OPMI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos, estableciendo los objetivos para reducir las brechas en áreas geográficas de los GR yGL.	Conjunto de proyectos programadas SEG OPMI, para ser ejecutada en un periodo determinado, asegurando con el presupuesto institucional modificado-PIM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Normas legales relacionado con la ejecución de proyectos inversión.</li> <li>▪ Planificación eficaz en la ejecución presupuestal.</li> <li>▪ Ejecución de proyectos con eficaz físico y financiero.</li> <li>▪ Funcionamiento control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importe del Presupuesto Institucional de Apertura</li> <li>▪ Nivel de ejecución del Presupuesto Modificado Institucional.</li> <li>▪ Indicadores de Eficacia.</li> </ul>
Cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo Municipal.	Mediante Ley N° 29332 y modificatorias, y entró en operatividad en el año 2010. Es una herramienta de Incentivos Presupuestarios Vinculado al Presupuesto por Resultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que promueve la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional.	Para cumplir la Meta 1, las Municipalidades deben alcanzar el puntaje mínimo establecido en el Cuadro de actividades, de acuerdo a las Especificaciones que se detallan a continuación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ejecución de inversiones del PIM</li> <li>▪ Registro del Formato N° 12- B: Seguimiento a la ejecución de inversiones”</li> <li>▪ Diagnóstico de cierre de inversiones</li> <li>▪ Registro del Formato N° 09: “Registro de Cierre de Inversión” 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nivel de cumplimiento de metas del PIM.</li> <li>▪ Porcentaje del presupuesto ejecutado y devengado</li> <li>▪ Número de metas programadas</li> </ul>

Fuente: (Mef, 2019)

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/invierte/INVIERTE.PE.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/invierte/INVIERTE.PE.pdf)

## **1.7. Justificación del estudio**

La justificación implica sustentar el por qué y para qué de la investigación, se fundamenta las razones que motivaron realizar el estudio, asimismo demostrar por qué el estudio es necesario e importante.

### **1.7.1. Justificación teórica**

Este trabajo de investigación se justificó mediante la teoría y conceptos básicos del MEF, cuyo propósito fue dar conocer temas sobre los variables de ejecución de proyectos de inversión y cumplimiento de metas del Programa de Incentivos en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019, así como los resultados que se obtuvieron de las conclusiones los cuales transbordaron a los ejecutivos para mejorar la ejecución de proyectos de inversión, con una buena estrategia de planificación, cumpliendo las cronogramas establecidas en los proyecto y luego obtener mayores recursos de incentivo, para mejorar los servicios básico de la población de Huanta.

### **1.7.2. Justificación practica**

La presente investigación proyectara dar a conocer al ejecutivo y funcionarios de alta dirección de la Municipalidad de Huanta, para realizar un plan estratégico para una eficiente y oportuno ejecución de los proyectos de inversión, para obtener mayores recursos que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas, además, estarepercute en la mejora de la gestión municipal y su cumplimiento de meta de ejecución de los proyectos que benefician a la mayoría de la población y las recaudaciones de los contribuyente será incrementada para mejorar los servicios básicos. Esta investigación será presentada a la Municipalidad como su posible ejecución de la gestión actual.

### 1.7.3. Justificación metodológica

Al realizar un análisis de los variables de Ejecución de los Proyectos de Inversión y cumplimiento de meta, en marco al Programa de Incentivos y logro de análisis a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas por la consulta amigable los proyectos de inversiones programadas para el año 2019, las ejecuciones financieras y la ejecución físico en la Gerencia de Infraestructura y gestión territorial de la municipalidad Huanta. Por ello se elaboró dos instrumentos para la recolección de información, para su procesamiento y análisis estadístico que permitirá realizar un análisis minucioso sobre la ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de meta del Plan de Incentivos en la Municipalidad Provincial de Huanta. Los resultados difundidos y compartidos con la actual gestión permitirán optimizar la gestión de gastos de las municipalidades y permitirá realizar una gestión de calidad cumpliendo con sus promesas de trabajar en beneficio de los ciudadanos. El presente estudio de investigación fue de diseño no experimental, transversal, descriptivo, para alcanzar los objetivos del estudio, el cual permitirá conocer el nivel de logro sobre ejecución de proyectos de inversión y cumplimiento de metas del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta.

## **1.8. Antecedentes internacionales y nacional**

### 1.8.1. Antecedentes Internacionales

**Según** (Cerdan, 2011), en su estudio Titulado “Análisis de la capacidad de gestión local y administración de recursos económicos en proyectos de inversión social de la Federación de Nacionalidades Kichwas del Napo”. Especialización en Desarrollo Local y Territorio; FLACSO - Sede Ecuador. Quito. (129 p).

En la presente investigación, lo que se pretende es realizar un “Análisis de la Capacidad de Gestión Local y la Administración de los Recursos Económicos en Proyectos de Inversión social de la FONAKIN “ Esta organización , durante el proceso de desarrollo de sus comunidades de base ha suscrito varios convenios para la ejecución de proyectos de desarrollo social y por lo que es necesario conocer sus particularidades respecto de su capacidad de gestión en ámbitos como el manejo de los recursos financieros, las metodología, la asistencia técnica , identificando los elementos que determinen las debilidades y fortalezas, en la gestión administrativa. De igual forma la presente tesina busca identificar qué tipos de inversiones han realizado las Organizaciones no Gubernamentales ONGs y los montos invertidos, para dar alternativas organizativas, de gestión y control que permitan fortalecer, al capital humano y al capital social, fortalecer la autogestión administrativa. Para que en lo posterior la FONAKIN, tenga una capacidad organizativa que supere la media nacional de las Organizaciones Indígenas, y puede captar recursos económicos internacionales, para invertir en proyectos que generen ingresos, primero para las familias en las comunidades y luego para la sostenibilidad de la organización.

**Según** (Calcina, 2019), en su Estudio Titulado “*Los Proyectos del Sector Social en*

*la Fase de Ejecución en el Presupuesto Pública, del Gobierno Autónomo Municipal de El Ato 2001-2017*”, (Tesis de Grado), en la Universidad Mayor de San Andrés La Paz-Bolivia, y expone el siguiente planteamiento del problema: ineficiente ejecución de los proyectos del sector social en el presupuesto de inversión pública del GAMEA. El tema de investigación tiene como objetivo general demostrar la Asignación en fase de Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, destinada al sector Social, del GAMEA, la hipótesis de trabajo se centra en: los sub-sectores urbanismo y vivienda tienen mayor ejecución de proyectos del presupuesto de inversión pública, en relación a la ejecución de los sub-sectores educación y cultura, salud seguridad social, y saneamiento básico. La "Referencia Metodológica del tema de Investigación" que precisa la delimitación del tema, se especifica las categorías y variables económicas, y se plantea la identificación y planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y la aplicación metodológica de investigación, además de aspectos conceptuales y teóricos.

La Fundamentación “Aspectos de Políticas, Normas e Institucional”, que se relacionan e influyen sobre las categorías y variables económicas. Desarrolla los "Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de Investigación", se describe, explica y compara entre dos periodos de estudio, Modelo de Economía de Mercado y Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo, a partir de variables económicas. Sostiene las conclusiones y recomendaciones del tema de investigación y señala la desigual ejecución de los proyectos del presupuesto de inversión pública en el sector Social.

**Según**, (Romero, 2015), en su Estudio Titulado “*Baja ejecución presupuestaria en inversión pública en los gobiernos municipales de Bolivia*” ha llegado determinar lo siguiente:

En Bolivia, al igual que en casi todos los países existe una elevada crisis en el

manejo de las instituciones públicas, siempre cuestionadas por su ineficiencia e ineficacia, en la gestión y logro de sus objetivos, al extremo de que la ciudadanía asocia a la administración pública como sinónimo de mala gestión. Este último razonamiento nos lleva a la conclusión previa que la administración pública debe ser preponderadamente eficiente y eficaz en el logro de sus resultados alcanzados. A los gobiernos municipales de Bolivia se los considera ineficientes en la ejecución de sus recursos, al efecto no se han destinado muchos esfuerzos hacia la investigación del manejo financiero de los ingresos y gastos que ejecutan estas, que centren su atención en los resultados obtenidos. Los Estados de Ejecución Presupuestaria deben evaluarse desde un punto de vista estructural, económico que nos muestre, en el caso de los gastos, la parte corriente, y de gastos de capital. Estudios y análisis sobre la ejecución financiera del gasto público en particular, y el impacto de esta gestión pública sobre el desarrollo local no se han efectuado en el país.

Según (Romero R., 2016), en su estudio tesis titulado, *“Análisis de la Ejecución de la Inversión Pública y su Incidencia de la Calidad de vida de la población, Región Libertad 2014”*. Analizo las comparaciones de la ejecución y los indicadores sectoriales al año 2015, los proyectos programados para su ejecución se refleja ineficiente capacidad de gastos en los proyectos de inversiones por parte del gobierno regional de La Libertad-Perú, con la ejecución insuficiente siguen existiendo las brechas con mayor necesidades y desigualdad en la región, sobre todo en las zonas rurales, sin embargo, las entidades sectoriales requieren evaluar resultados de la asignación de recursos. En el presente investigación se consideró los variables independientes ejecución de proyectos de inversión y el otro variable dependiente Calidad de vida de la población, tipo de diseño No experimental, Longitudinal de Evolución y descriptivo, población para la muestra se consideró 25 personas, la muestra se consideró en n= 1 región la Libertad (muestreado no probabilístico), utilizando los instrumentos de recolección de datos (técnica) entrevistas y análisis

de contenido, instrumento; guías de análisis de contenidos y observaciones, estrategia de metodología de Revisar la ejecución de la inversión pública con la finalidad de dar a conocer las brechas de acceso a los servicios que existen en la Región La Libertad y resultados obtenidos Según la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011- EF/68.01, en su artículo 25 señala lo siguiente sobre la ejecución de la inversión pública: Por tal los resultados mostrados en la región La Libertad aún persiste una brecha de cobertura en el sector de educación, salud, energía, agua y desagüe, por lo se deberá priorizar para mejorar la calidad de vida de la población.

Según los autores (Valarzo, Delgado y Vérez, 2016), en sus estudios Titulado, *“Estudio de factibilidad en el sistema de dirección por proyectos de inversión”*. Han sido planteadas para medir el sistema de dirección y gestión de los proyectos en general, necesita de una evaluación efectiva que les permita a través de un conjunto de indicadores, establecer las prioridades de la demanda de proyectos en función de la disponibilidad real que brindan las fuentes de financiamiento tanto nacionales como internacionales. El método científico empleado es el análisis del estudio de factibilidad en cada una de las fases definidas por el PMBOK con la profundidad necesaria como para obtener sus resultados parciales y la síntesis como integración de todo el sistema tanto internamente como con las partes externas interesadas en el proyecto durante el ciclo de vida de la inversión. Obteniendo los resultados el procedimiento del estudio de factibilidad en el sistema de dirección por proyectos representa una herramienta muy útil para los Directores que ejecutan proyectos. Sin embargo, es en el proceso de ejecución del ciclo del proyecto en donde se presenta el mayor número de cambios. Si los cambios inapropiados, festivos y ordenados por fuentes no autorizadas, terminan por modificar el alcance del proyecto, resultados de una toma inadecuada de decisiones.

### 1.8.2. Antecedentes Nacional

**Según** (Clemente, 2016), en su Estudio titulado *“Ejecución de proyectos de inversión y desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Peru-2016”*. El objetivo de la investigación fue: Determinar la relación que existe entre la ejecución de proyectos de inversión y el desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la hipótesis planteada: existe una relación positiva entre la ejecución de proyectos de inversión y el desarrollo económico. Se utilizó el método científico, tipo no experimental, diseño correlacional; la técnica fue la encuesta el instrumento fue dos cuestionarios sobre ejecución de proyectos de inversión y desarrollo económico, para los resultados se ha utilizado del programa estadístico SPSS 21, Word y Excel 2010. Se concluyó el 7,14% de ejecución de proyectos regulares, ocasionan un desarrollo económico malo, el 21,42% de proyectos ni bueno ni malo, generan un buen desarrollo económico; el 28,58% de proyectos buenos, hacen que el desarrollo económico sea bueno y solo el 7,14% proyectos muy buenos, ocasionan muy buen desarrollo económico a nivel de la localidad de Huancavelica. Por lo tanto, existe una relación positiva entre la ejecución de proyectos de inversión y el desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, de acuerdo al valor de  $p = 0.018 < 0.05$ , y es un Chi Cuadrado = 24,40 > al valor de tabla = 21,03.

**Según**, (Chilón, 2016), en su Estudio Titulado *“Capacidad de Ejecución del Gasto Público de los Proyectos de Inversión en la Municipalidad Provincial de Huayayoc-Bambamarca”*, concluye, La falta del desarrollo integral socioeconómico de la población rural y urbana de la región Cajamarca y en particular del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, ha generado un gran malestar y preocupación de la población, básicamente por la incapacidad de ejecución del gasto público de los proyectos de inversión. El objetivo es analizar e identificar los factores más relevantes que limitan la capacidad de ejecución del gasto de inversión, en base a las normas que regula la ejecución del gasto público, proyectos de inversión y procesos de contratación; con el propósito de diseñar una estrategia orientada a mejorar la capacidad de la ejecución del gasto

de inversión. El período de análisis articula los tres primeros años del período de gobierno municipal 2007-2009 y 2011-2013. Teniendo como variables la capacidad de ejecución del gasto público y la ejecución de proyectos de inversión; siendo los indicadores el equipo técnico, proyectos de inversión, procedimientos de procesos y proceso de selección y ejecución contractual, obtenidos de la Municipalidad en referencia, Ministerio de Economía y Finanzas y Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado. La metodología es de tipo descriptiva, ex post facto y de corte longitudinal. Como resultado de la investigación se concluye que el promedio del gasto de inversión ejecutado durante el período en estudio, fue menos del 25% del presupuesto programado, esto como consecuencia de algunos factores más relevantes como son: La carencia de un equipo técnico con capacidades y habilidades para asumir el cargo designado, carencia de una cartera de proyectos a nivel de perfil y expediente técnico, demora en los procesos de contratación de los proyectos de inversión debido a un número limitado de comités especiales permanentes sin capacitación y experiencia y ausencia de un manual de procedimientos. Planteándose finalmente como aporte de la investigación una estrategia y sugerencias que contribuyen a mejorar la capacidad de ejecución del gasto de inversión a los gobiernos locales.

**Según,** (Fernández, Chaiña, 2019), en su Estudio realizado en la Universidad Nacional del Antiplano-Puno, en su Título, *“Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y el Cumplimiento de la metas de la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave periodo 2016-2017”*, en su investigación tuvo como objetivo principal evaluar y analizar la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y gastos; y su incidencia en el cumplimiento de Metas Programadas de la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave, para los ejercicios fiscales 2016-2017, seguidamente los objetivos específicos fueron: analizar la Programación Presupuestaria y su incidencia en la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de El Collao- Ilave y determinar el Nivel de Eficacia de la Ejecución Presupuestaria respecto al cumplimiento de Metas de la Municipalidad

Provincial de El Collao- Ilave. Se empleó el método deductivo de diseño No Experimental, Descriptivo, Correlacional, desarrollando la información mediante la observación directa, llegando a las siguientes conclusiones: Respecto al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2016, se tuvo un presupuesto PIM de S/. 58,658,962.00 Soles, lográndose ejecutar un monto total de S/. 48,693,473.00 Soles, que representa el 83.01% de lo programado, con un indicador de eficacia de 0.83 mostrando así, una capacidad de gasto deficiente, para el ejercicio fiscal 2017, se hizo una programación PIM por un monto de S/. 36,674,602.00 Soles, logrando ejecutar un monto de S/. 30,799,297.00 Soles que representa el 83.98% de lo programado, con un indicador de eficacia de 0.84, cumpliendo de forma regular la ejecución presupuestaria del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal.

**Según,** (Mamani, 2017), en su Tesis Titulado, “*Gestión Administrativa de los Recursos y el Cumplimiento del Programa de Incentivo Municipal del Distrito de Ponoti-Azángaro, periodo 2013 y 2015*”, (Tesis de Maestría) en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. Utilizando la metodología de investigación correlacionada, diseño no experimental, las muestras están conformada por la Municipalidad a través de los funcionarios, utilizó como instrumento, llegando a los siguientes resultados; que, existen influencia entre la gestión administrativa de los recursos y el cumplimiento del plan de incentivo municipal. Las autoridades y los funcionarios municipales, desconociendo las funciones municipales que ocuparon los cargos de confianza, no han permitido cumplir con las metas anuales, realizar los procedimientos administrativos en el uso de los recursos del plan de incentivo. Los funcionarios designados como responsables de los cumplimientos de metas, tenían desconocimiento del procedimiento que deberían realizar para cumplir sus metas. Los recursos del plan de incentivo lo han orientado a los proyectos y actividades

enmarcadas en los objetivos del PI, sin embargo no han realizado los procedimientos correctos para el buen uso de gastos, asimismo se evidencia en los expedientes de gasto que tiene serias deficiencias documentales. Al alineamiento presupuestal (calidad de Inversión) relativamente se orientó el gasto a los objetivos del Plan de Incentivos, las inversiones en las metas presupuestales recomendadas por el MEF fueron muy débiles, por lo que no se está manejando adecuadamente los recursos del PI con un criterio de sostenibilidad, lo que evidencia que hubo desconocimiento de los objetivos del PI y además no se consideró las prohibiciones que se indica en la guía de uso de los recursos del PI.

**Según, los** (Choquehuanca y Chávez, 2019), en sus Tesis Titulado, “Plan de incentivo y su incidencia en la calidad de gastos públicos de la Municipalidad Distrital de Soritor-Periodo-2015-2016”, (para optar el Título Profesional de Contador Público) en la Universidad Nacional de San Martín, realizó la investigación sobre; El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), es una herramienta de Incentivos Presupuestarios vinculado al Presupuesto por Resultado (PpR), la cual pretende destacar y hacer de conocimiento público el desempeño que tienen las municipalidades en el cumplimiento de metas asignadas; el PI implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. La calidad del gasto público abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía. El objetivo de la presente investigación fue analizar en qué medida el plan de incentivos incide en la calidad de gasto público de la Municipalidad Distrital de Soritor en el periodo 2015 – 2016, para ello se utilizaron dos variables, el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal y el gasto público, relacionándolo en función a la ejecución presupuestal

y finalidad de la misma. Los resultados obtenidos se muestran en tablas y gráficos y se hace un análisis de cada variable en estudio, con énfasis en los recursos asignados a la Municipalidad Distrital de Soritor a través del plan de incentivos por el cumplimiento de metas y su impacto en la calidad del gasto público, analizado principalmente en la ejecución de obras públicas con dichos recursos. Se concluye que existe una mejora de la calidad del gasto público en la Municipalidad Distrital de Soritor debido a la implementación y cumplimiento de las metas del plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que durante el periodo de estudio 2015 – 2016, significó un incremento del 35.5% y 16.1%, del presupuesto total anual, respectivamente.

**Según** (Ramírez, 2018), en su Estudio planteado *“Programa de incentivos en la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho 2017”*, para obtener el título de Licenciada en Administración, en la Universidad Cesar Vallejo, El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo principal describir el nivel de logro el Programa de Incentivos en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2017. Este trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, aplicado, de diseño no experimental, transversal. El soporte teórico es la página del Ministerio de Economía y Fianzas. La muestra estuvo conformada por 50 trabajadores de dos áreas involucradas como la Gerencia de Administración tributaria y la Gerencia de Administración Financiera, los datos recolectados a través de la encuesta fueron procesados y analizados por el programa estadístico SPSS versión 24. La validez se desarrolló a través del juicio de expertos mediante un cuestionario de validación, así mismo el Alfa de CronBach dando como resultado 0.779 que demuestra respetable confiabilidad. Esta investigación concluye que el nivel logro del programa de incentivos en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho es

buena con un 46%, un 38% regular y 16% muy bueno, esto según la percepción de los trabajadores de la municipalidad de las áreas yamencionadas.

## **1.9. Marco teórico**

### 1.9.1. Conceptos de Ejecución de proyectos de inversión

La formulación y evaluación de proyectos se precisó por primera vez en 1958. Asimismo, la manera de desarrollar proyectos de inversión, en su forma más general sigue prevaleciendo, esto es, para evaluar cuantitativamente los beneficios posibles de un proyecto es necesario recopilar y analizar información que ayude a determinar la viabilidad de implementación de un proyecto.

A los inicios de la década de los 70, no era común escuchar sobre proyectos de inversión, sobre todo hablando de micro y pequeñas empresas. En esa época, la realización de las inversiones obedecía las recomendaciones de conocidos, quienes tenían negocios exitosos bien, porque en alguna zona no existía ningún negocio similar al que pensaban abrir.

¿Qué riesgos crees que se corren al aplicar este tipo de prácticas en la actualidad para realizar una inversión?, ¿crees que se sigan implementando?

**Según los autores** (Bazar & Pinedo, 2019), “*Planificación en la Oficina Presupuestal y su Relación con la Ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2016*”, (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín. En esta investigación se analizó la relación entre la planificación en la oficina de presupuesto y la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de San Martín en el periodo 2016, con la finalidad de conocer el estado de la planificación en la oficina de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Martín, asimismo se toma en cuenta los aspectos que

permitan mejorar esta situación y posteriormente proponer acciones fundamentado en teorías de Béjar y la Municipalidad Provincial de San Martín, además esta investigación servirá de aporte para investigaciones con escenarios similares la cual se podrá comparar con las teorías dadas por los autores mencionados y otros estudios expuestos por investigadores. La presente investigación es no experimental, correlacional; la muestra está constituida por 11 colaboradores del área de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Martín. Para finalmente concluir que existe una relación positiva debido a la interdependencia de la variable planificación sobre la variable ejecución presupuestal mostrada en la investigación.

### **Programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria**

La presente Directiva tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (en adelante entidades), programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los periodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario. **Según,** (Directiva 002, 2019)

Ejecución de proyectos inversión por distritos el avance presupuestal para el cumplimiento de meta.

**Tabla 2 Ejecución Presupuestal por Distrito de la Provincia de Huanta**

Año de Ejecución: 2019  
Incluye: Sólo Proyectos

Departamento 05: AYACUCHO	255,412,889	992,904,672	886,310,897	778,742,236	715,423,762	679,876,026	679,121,437	68.5
Provincia 0504: HUANTA	39,694,642	168,758,337	135,957,581	116,434,243	110,841,703	96,288,499	96,273,807	57.1
Municipalidad	PI A	PI M	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Ejecución		Avance %
						Devengado	Girado	
050401-300464: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	9,871,094	46,084,526	41,542,913	31,488,280	30,108,190	26,112,051	26,109,732	<b>56.7</b>
050402-300465: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	4,518,369	9,344,583	9,109,003	8,413,823	8,413,823	8,413,223	8,413,223	<b>90.0</b>
050403-300466: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA	497,656	7,027,197	6,213,573	5,993,031	5,993,031	5,993,031	5,992,784	<b>85.3</b>
050404-300467: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN	268,208	5,478,972	5,117,279	5,048,236	5,019,246	5,012,415	5,002,083	<b>91.5</b>
050405-300468: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA	508,439	9,509,793	8,908,805	8,899,286	8,763,894	4,972,746	4,972,746	<b>52.3</b>
050406-300469: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	581,817	11,641,483	10,168,119	6,706,995	3,389,077	3,389,077	3,389,077	<b>29.1</b>
050407-300470: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA	5,045,743	14,623,676	14,329,067	12,611,052	12,308,519	9,911,906	9,911,906	<b>67.8</b>

050408-301837: MUNICIPALIDAD DISTRITALDE LLOCHEGUA	1,304,646	31,254,531	9,114,489	8,351,508	8,343,508	8,343,508	8,343,508	<b>26.7</b>
050409-301850: MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CANAYRE	6,033,374	11,760,715	11,208,212	11,096,562	11,096,562	11,096,562	11,096,322	<b>94.4</b>
050410-301862: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCA Y	3,808,660	10,967,227	10,601,854	10,153,867	10,104,337	10,104,337	10,102,783	<b>92.1</b>
050411-301866: MUNICIPALIDAD DISTRITALDE PUCACOLPA	6,781,450	9,474,810	8,456,979	6,536,327	6,399,327	2,046,145	2,046,145	<b>21.6</b>
050412-301874: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA	475,186	1,590,824	1,187,289	1,135,276	902,190	893,499	893,499	<b>56.2</b>

Fuente: mef. Consulta amigable 2019

Esta tabla de presentación es la ejecución de presupuesto de proyectos de inversión de los distritos de la provincia, esta se refleja que cada municipio a cuanto porcentaje llegó a ejecutar su presupuesto en los proyectos de inversión, considerando su PIA, PIM y PMI, aquí lo que se ve cuantos municipalidades han alcanzado a ejecutar más de 80% para cumplir la meta 1, del programa de incentivo municipal y así obtuvieron resultados positivos incluso con bonos adicionales, pero según las comparaciones realizadas que la municipalidad provincial de Huanta, solo alcanzo a ejecutar su presupuesto al 56.7% obteniendo resultados negativos.

Figura 1 *Presupuesto y ejecución*

*Fuente: MEF consulta amigable 2019.*

En este grafico vemos los presupuestos obtenidos y ejecutados por distrito de la provincia de Huanta, el presupuesto institucional modificado y devengado de presupuestos durante la ejecución de los proyectos de inversión y cumplimiento de metas del PIM 2019.



2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	3,199,479	20,000	0	0	0	0	0	0.0
2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	580,000	580,000	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	10.0
2014658: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	990,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	200,000	5,006	0	0	0	0	0	0.0
2045164: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA	0	1,238,723	1,214,180	0	0	0	0	0.0
2143419: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	60,832	0	0	0	0	0	0.0
2144502: CONSTRUCCION DEL ESTADIO Y SEMBRADO DE GRASS EN LA COMUNIDAD DE VILLA FLORIDA, DISTRITO DE IGUAIN -HUANTA - AYACUCHO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0
2148884: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL PSJ. MONTONEROS YJR. CESAR URBANO IRA CUADRA EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	13,072	0	0	0	0	0	0.0
2148885: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL PSJ. GARCILAZO DE LA VEGA Y PSJ. CAHUIDE EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,173	0	0	0	0	0	0.0



2207613: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL BARRIO DE CASTROPAMPA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,620	0	0	0	0	0	0.0
2212253: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL PARQUE INFANTIL MORRO TUPIN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	200	200	200	200	200	200	100.0
2212969: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN ZONAS ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	732,499	750,497	750,495	677,982	677,982	677,982	677,264	90.3
2214488: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2214551: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE EDUCACION PRIMARIA N38262/MX-P CARMEN SOTO FLORES DEL CENTRO POBLADO DE UYUVIRCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2222659: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACA, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	126,701	120,049	115,246	115,246	115,246	115,246	91.0
2223313: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL DIVINO NIÑO JESUS	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0.0



2251686: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LA I.E. 429-156MX-P, I.E.38268, I.E. 429- 158MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE VISTA ALEGRE, SIVIA, CINTIARO EN LOS DISTRITOS DE SIVIA Y CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,783,320	7,781,433	7,713,320	7,642,150	7,642,150	7,642,150	98.2
2263261: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS ORIENTADO A LA NUEVA EXPANSION URBANA Y PERIURBANA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0
2264082: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL JR. ANTENOR ORREGO CDRA. 1 AL 3, PJE. J. DE LA RIVA AGÜERO, JR. VELANDO CDRA. 1 Y 2, PJE MIGUEL GRAU, JR. RICARDO PALMA CDRA. 1 Y 2, PJE. ORREGO, PJE. GARCILASO DE LA VEGA CDRA. 2 DEL BARRIO OCHO, DI	0	4,958	3,990	0	0	0	0	0.0
2267395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA EN LA RED VIAL VECINAL CANAYRE - CORONEL PORTILLO, JUNIN LIBERTAD - NUEVO PROGRESO - ROSARIO SANTILLANA - VIRGEN CCASA, EN LOS DISTRITOS DE LLOCHEGUA Y CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	6,811,285	6,810,572	6,810,572	6,810,572	2,863,183	2,863,183	42.0

2288272: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOSAGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES, CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	518,111	518,109	493,665	493,665	493,665	493,665	95.3
2289539: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N 38881MX-U DE LA LOCALIDAD DE LLAQLLAN, DISTRITO DE UCHURACCAY,PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
2289930: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR. PUNOCDRA. 01; JR. 2 DE MAYO CDRA. 01 AL 07, JR. RICARDO URBANO CDRA 04; JR. MANCO CAPAC CDRA. 04, JR. FELIX IGUAIN CDRA. 04 DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AY	0	2,392,121	2,390,013	1,559,933	1,289,963	1,289,963	1,289,680	53.9
2307565: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL ENEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0
2324579: CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	362,790	362,789	296,584	296,584	296,584	296,584	81.8

2338421: RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC DISTRITO DE HUANTA Y LURIOCHA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	990,000	958,101	861,870	840,720	840,720	840,720	84.9
2340601: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS	0	33,000	0	0	0	0	0	0.0
2369700: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA AVENIDAGERVASIO SANTILLANA CUADRA 1 Y 2, JIRON TARAPACA CUADRA 1 Y 2, Y EL PERIMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL DE HUANTA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAME	0	593,415	593,414	538,125	538,125	538,125	538,125	90.7
2369907: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MAESTRANZA DEL GARAJE MUNICIPAL EN EL SECTOR DE UYUVIRCA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	274,070	219,988	182,945	182,945	182,945	182,945	66.8
2370592: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 24 DE JUNIO 2DA CUADRA, JR. VICTOR RAUL YANGALI CASTRO CUADRA 1 Y 2, JR. LOS PROCERES, JR. HUGO MATTATELLO 1ERA CUADRA Y PASAJE LA PAZ, DEL BARRIO HOSPITAL BAJA. HUANTA - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA	0	33,503	33,503	25,127	25,127	25,127	25,127	75.0

2390297: CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DEHUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	188,434	188,433	182,425	182,425	182,425	182,425	96.8
2390326: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE HUANZA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	242,631	242,631	234,737	234,737	234,737	234,737	96.7
2423285: ADQUISICION DE KITS O MATERIALES PARA EXPERIMENTOS DE BIOLOGIA; EN EL(LA) PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCADE LA FRUTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
2424104: ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	215,322	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	98.9
2428029: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IMPAO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTODE AYACUCHO	0	252,276	252,275	221,531	221,531	221,531	221,531	87.8
2429279: CONSTRUCCION DE AULA; EN EL(LA) IE 38254 LUIS CAVERO BENDEZU -HUANTA EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	23,879	23,052	23,052	23,052	23,052	23,052	96.5

2433514: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DE LA ALAMEDA MILTON CORDOVA LA TORRE DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	930	930	0	0	0	0	0.0
2434289: CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL PAGO DE CCACCAS DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	376,708	376,706	369,302	369,302	369,302	369,302	98.0
2434934: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE CRIANZA DE CUY EN LA ASOCIACION DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES DE CALLQUI BAJA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,500	100,000	59,747	59,747	59,747	59,747	54.6
2435077: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	109,000	94,444	94,444	94,444	94,444	86.6
2435154: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GANADO OVINO DE LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE CULLUCHACA EN EL SECTOR SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	108,998	59,348	59,348	59,348	59,348	54.4

2435311: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES POR LA VERDAD Y JUSTICIA EN LA COMUNIDAD DE MIO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTODE AYACUCHO	0	109,000	108,999	49,881	49,881	49,881	49,881	45.8
2437660: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV.GERVASIO SANTILLANA CUADRA 13 AL 16; AV. CARLOS LA TORRE CUADRA 1 AL 11,AV. CIRCUNVALACION ESTE CUADRA 2 A 4; JR.LUIS CAVERO CUADRA 3 Y 4, JR.VICTOR FAJARDO CUADRA 1 Y 2, JR. PEDRO	0	2,925,804	2,729,438	2,270,862	1,331,112	1,331,112	1,330,971	45.5
2445273: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTODE AYACUCHO	0	2,933,070	266,518	240,018	240,018	240,018	240,018	8.2
2450058: ADQUISICION DE ; EN EL(LA) INSUMO Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DEPULGON Y TRIPS EN TARA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	80,000	80,000	70,605	70,605	70,605	70,605	88.3
2451686: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR.SALVADOR CAVERO CDRA 3, JR. MARIANO SOSA, JR. CHAVEZ GAVILAN CDRA 4 Y 5, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	1,027,246	1,027,244	1,004,314	992,414	992,414	992,414	96.6


2451890: RENOVACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) BCT LOS CABITOS N°51 CASTROPAMPA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	97,342	97,341	0	0	0	0	0.0
2451891: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) ZONA DE CHANCARAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	91,557	91,557	85,039	85,039	85,039	85,039	92.9
2452344: RENOVACION DE ; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD MIODISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	45,729	4,800	0	0	0	0	0.0
2452419: ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) PARA MEJORARLA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	1,000,000	973,640	936,588	936,588	936,588	936,588	93.7
2453495: REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) VIAS URBANAS DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	190,000	190,000	179,369	179,369	179,369	178,192	94.4
2455012: RENOVACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	100,000	100,000	78,684	78,684	78,684	78,684	78.7

2457144: REPARACION DE CANAL DE RIEGO;EN EL(LA) LOCALIDAD DE VIRU VIRU, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	149,265	149,264	121,156	121,156	121,156	121,156	81.2
2462550: CONSTRUCCION DE CARRETERASDE ACCESO; EN EL(LA) CHULA- RAZUHUILCA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	250,000	250,000	110,572	110,572	110,572	110,572	44.2
2466980: RENOVACION DE VIAS DE ACCESO;EN EL(LA) ZONA PERI URBANA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	39,682	0	0	0	0	0	0.0
2472744: ADQUISICION DE GRUPOS DE INSTRUMENTOS; EN EL(LA) GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	10,845	0	0	0	0	0	0.0

---

Fuente: MEF-Consulta amigable 2019

**Figura 2** Ejecución de presupuesto por producto

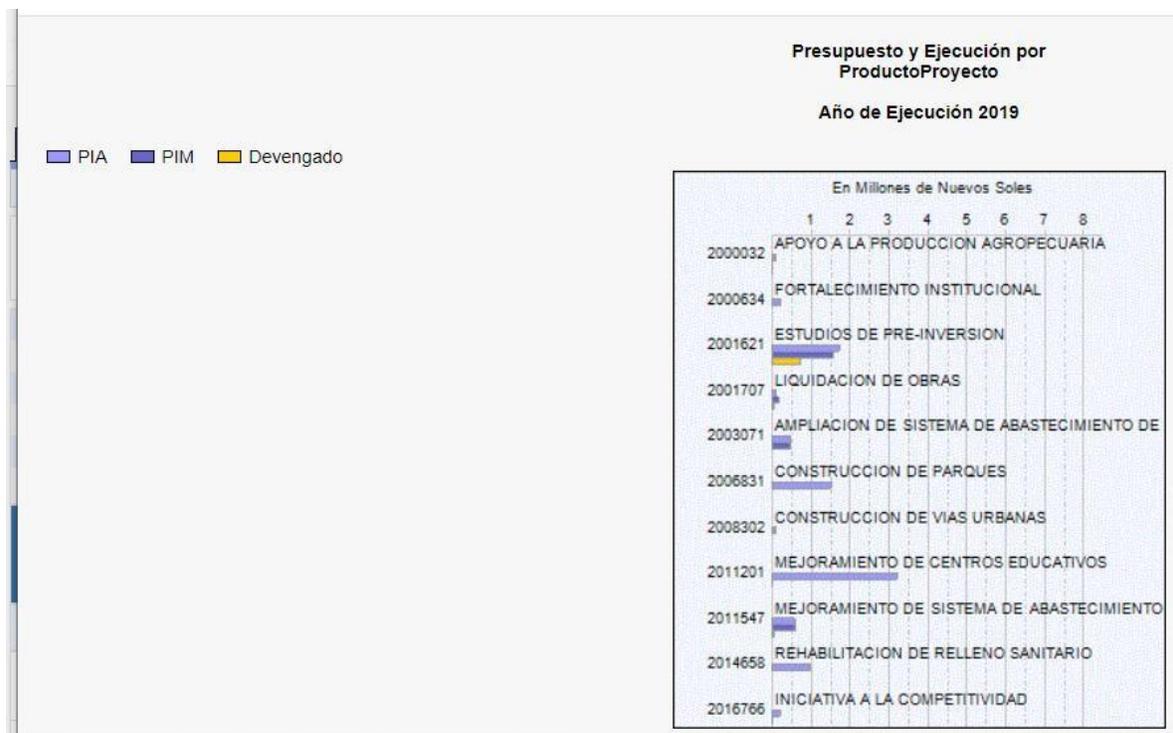

### 1.9.2. Características

Un Proyecto de Inversión debe cumplir con las características de ser una intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son independientes de los de otros proyectos.

Según la Directiva N° 002-2019-EF/50.01, se tomará en cuenta las referencias, así como las definiciones de los términos contemplados en el Anexo N° 1, “Definiciones para efectos de la Programación Multianual”, y de los términos que a continuación se indican:

a) **Decreto Legislativo N° 1440:** Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público.

b) (Congreso Republica, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 2004),  
*Ley General: Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.*

c) Entidad Pública: Constituye Entidad Pública, todo organismo con personería jurídica de derecho público comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos.

**d) Programación Multianual Presupuestaria:** La Programación Multianual Presupuestaria es la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las Asignaciones Presupuestarias Multianuales (APM) de los tres años consecutivos siguientes para el logro de metas de productos e inversiones vinculados a: (i) resultados priorizados en las leyes anuales del presupuesto; (ii) resultados sectoriales y; (iii) objetivos estratégicos institucionales priorizados en las instancias correspondientes, según corresponda a cada Entidad.

El primer año de la Programación Multianual Presupuestaria es el límite máximo de créditos presupuestarios para la Formulación Presupuestaria a cargo del Pliego, cuyo detalle se determinará en dicha fase. La Programación Multianual Presupuestaria debe registrarse en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) o en el aplicativo desarrollado para estefin.

La Programación Multianual Presupuestaria se actualiza anualmente, reajustando la APM en los casos que fuera necesario, y añadiendo un año nuevo en cada programación.

La Programación Multianual Presupuestaria debe tener en cuenta los supuestos de

proyección del Informe del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) con la actualización de las principales variables macroeconómicas y fiscales, al que se refiere el numeral 11.2 del artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero sobre la base de las reglas fiscales.

**e) Formulación Presupuestaria:** Constituye la fase del proceso presupuestario en el que las entidades públicas desagregan, distribuyen y estructuran la información del primer año de la Programación Multianual Presupuestaria utilizando la clasificación de ingresos, gastos, fuentes de financiamiento y geográfica, así como las metas presupuestarias, la estructura funcional programática.

**f) Asignación Presupuestaria Multianual (APM):** Es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada entidad. Las APM son calculadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el año cuyo presupuesto se esté elaborando (año 1) y los 2 años siguientes (años 2 y 3). Las APM se calculan teniendo en cuenta la programación de ingresos y gastos, sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, resultados priorizados y coyuntura económica.

La APM tiene carácter vinculante para el primer año (año 1) e indicativo para los dos años siguientes (año 2 y año 3), y es revisada anualmente y modificada en caso haya cambios en cualquiera de los factores tomados en cuenta para su estimación.

**g) Módulo de Programación Multianual:** Aplicativo informático que permite el registro de las APM (por un periodo de tres años).

**h) Módulo de Recolección de Datos:** Aplicativo informático que permite a los Pliegos de los tres niveles de gobierno el registro de información complementaria

definida en la presente directiva, según corresponda, la cual será empleada para la estimación de la APM o para el análisis del sustento de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

**i) Proyectos:** Comprende las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación); y de proyectos que no se encuentran bajo dicho sistema (tales como los proyectos PROCOMPITE en el marco de la Ley N° 29337, los proyectos de inversión exonerados, entre otros). Adicionalmente, incluye los estudios de pre inversión. Para efecto del registro en el Módulo de Programación Multianual, corresponde a la clasificación económica de gastos de capital.

### 1.9.3. Teorías

La administración pública es una organización a través del cual se ejerce la acción del gobierno de acuerdo con la Ley. El presupuesto, las normas y reglamentos, orientada al establecimiento de metas y objetivos a la ejecución de actividades y al control y evaluación de la gestión del estado. Esta apreciación general, permite precisar que la administración pública se caracteriza porque básicamente se ocupa de los fines que concierne al Estado, lo cual la relación en toda su extensión con la sociedad y con la economía en su conjunto.

(Velásquez Guevara, 2019), *“Incidencia de la ejecución de proyectos de inversión pública en el crecimiento económico de las regiones del Perú, período 2007 – 2017”*.

El principal objetivo del estudio presentado fue analizar el impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública sobre el crecimiento económico del Perú, durante el período 2007 - 2017. Para el desarrollo del tema se planteó el problema, ¿cómo se concreta la

implementación de Los proyectos de inversión afectan el crecimiento económico de las regiones del Perú, durante el período 2007 - 2017 ?, la hipótesis propuesta sostiene que la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública tuvo un impacto en el Crecimiento Económico de las regiones del Perú. Asimismo, la teoría desarrollada por Harrod-Domar y otras teorías citadas que relacionan capital y producción apoyan la hipótesis propuesta. Se completó realizando un modelo econométrico de panel de datos con efectos fijos.

#### 1.9.4. Conceptos el cumplimiento de metas

Según él (Congreso Republica, Ley N° 29332, Ley que cree el plan de incentivo a la mejorado de la gestión municipal, 2009) y sus modificatorias, y entró en operatividad en el año 2010. Es una herramienta de Incentivos Presupuestarios vinculado al Presupuesto por Resultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que promueve la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional, Implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas del Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con las municipalidades.

El PI es un esquema de incentivos, monetario y no monetario, vinculado al cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son diseñadas por diversas entidades públicas del Gobierno Central con la finalidad de impulsar resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado y coordinado con las municipalidades.

Las metas establecidas en el PI se formulan en el marco de las competencias y funciones de las municipalidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley

Orgánica de Municipalidades, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de las municipalidades para proveer bienes y servicios a la población.

#### **Objetivos General del PI**

- Contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales.

#### **Objetivos específicos del PI**

- Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de inversiones, que están vinculadas a resultados en el marco de las competencias municipales, de acuerdo a lo establecido en la 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales.

#### 1.9.5. Características

#### **Las metas correspondientes al año 2019**

Las metas del Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, elaboradas en cumplimiento de los Lineamientos aprobados mediante Resolución Directoral N° 018.2018-EF/50.01, cuyo plazo máximo de cumplimiento es hasta el 31 de diciembre del año 2019.

La evaluación de las metas referidas en el párrafo precedente se realiza considerando las actividades, medios de verificación, las fechas límite, y los puntajes establecidos en los cuadros de actividades que son aprobadas mediante Resoluciones Directorales de la Dirección General de Presupuesto Público.

Transferencia de recursos por el cumplimiento de metas correspondiente del año 2019 La transferencia de recursos a favor de las municipalidades que cumplen las metas

correspondientes al año 2019, se realizan hasta mes de abril del año 2020 con cargo a los recursos que sean asignados al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal en la Ley de Presupuesto del sector público correspondiente al año 2020. Para ello el Ministerio de Economía y Finanzas con una directiva aprueban los cuadros de actividades, que a continuación presentamos la tabla.

**Tabla 4 Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento**

<b>Municipalidades adscrito a envierte.pe</b>															
Actividad	Descripción	A	B	Valla mínima			F	G	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	A	B	Puntaje		
				C	D	E							C	D	F
Actividad 1:	<u>Devengado 30 de abril de 2019</u>	20				25%				30 de abril				E	10
Ejecución de inversiones del PIM2	PIM 28 de febrero de 2019 <u>Devengado 28 de junio de 2019</u> PIM 28 de febrero de 2019	35				45%			Registro sobre ejecución de inversiones del PIM2/ en el Sistema Integrado de Administración Financiera	28 de junio					10
	<u>Devengado 30 de setiembre de 2019</u> PIM 28 de agosto de 2019	45				50%				30 de setiembre					15
	<u>Devengado 31 de diciembre de 2019</u> PIM 28 de agosto de 2019	75				80%				32 de diciembre					15
	<u>Devengado 31 de diciembre de 2019</u> PIM 28 de agosto de 2019	80				85%				31 de diciembre					10
<b>Municipalidades adscrito a envierte.pe</b>															
Actividad	Descripción	Valla mínima			Medio de	Fecha de	Puntaje								

		A	B	C	D	E	F	G	verificación	cumplimiento	A	B	C	D	E	F	G
Actividad 2: Registro del Formato N° 12-B: “Seguimiento a la ejecución de inversiones”	Realizar el registro del Formato N° 12-B: “Seguimiento a la ejecución de Inversiones” para una cantidad de inversiones que representan un porcentaje determinado del PIM al 28 de febrero 2019				10 %				Registro sobre ejecución de inversiones del PIM2/	30 de abril				10			
Actividad 3: Diagnóstico de cierre de inversiones	Realizar el registro del Formato N° 12-B: “Seguimiento a la ejecución de Inversiones” para una cantidad de inversiones que representan un porcentaje determinado del PIM al 28 de agosto 2019				45 %				en el Sistema Integrado de Administración Financiera	30 de octubre				10			
Actividad 4: Registro del Formato N° 09: “Registro de Cierre de Inversión”	Realizar el registro en el aplicativo del Banco de Inversiones del diagnóstico de cierre de inversiones del listado definido por la DGIP				10 %				Registro del diagnóstico de cierre de inversiones en el aplicativo del Banco de Inversiones	28 de junio				10			
	Realizar el registro del Formato N° 09: “Registro de cierre de inversión” para un porcentaje de las inversiones del listado definido por la DGIP, siendo indispensables que estas cuenten con el diagnóstico de cierre. PIM 28 de agosto de 2019				30 %				Registro del Formato N° 09: “Registro de Cierre de Inversión” en el Banco de Inversiones	29 de noviembre				10			
<b>Puntaje mínimo para cumplir la meta</b>											<b>80 PUNTOS</b>						
<b>Puntaje máxima</b>											<b>100 PUNTOS</b>						

### Los actores involucrados

El PI promueve el trabajo articulado entre las entidades públicas responsables de meta, las municipalidades y el Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, se detallan los principales roles de cada uno de ellos:

**Figura 3** *los actores involucrado MEF y sus funciones*



**Figura 4** *entidades públicas responsables de Meta y sus funciones*



**Figura 5** *Municipalidad involucrado y sus funciones*

### 1.9.6. Teorías

El MEF mediante Decreto Supremo N° 296-2018-EF, aprobó la clasificación municipal del PI, la misma que en su metodología recoge las diferencias existentes entre funciones municipales provinciales y distritales, la pertenencia a ciudades principales, y sus variables territoriales, la cual se presenta en la tabla siguiente:

**Figura 6** *Clasificación de las municipalidades*

Clasificación de municipalidades para el año 2019	Jurisdicción	Abreviatura	N°
Municipalidades pertenecientes a ciudades principales	Provincial	Tipo A	74
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales		Tipo B	122
Municipalidades de Lima Metropolitana	Distrital	Tipo C	42
Municipalidades pertenecientes a otras ciudades principales		Tipo D	129
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales, con más de 70% de población urbana		Tipo E	378
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales, con población urbana entre 35% y 70%		Tipo F	509
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales, con menos de 35% de población urbana		Tipo G	620
<b>Total</b>			<b>1874</b>

### El marco normativo que regula el PI

Anualmente el MEF regula el proceso normativo del PI. En el siguiente gráfico, se detallan los instrumentos utilizados en cada una de sus etapas:

**Figura 7** *Procedimientos de normativas*



**Figura 8** *Cronograma de procedimiento normativo*

## ¿En qué momentos ocurrirán los hitos clave del PI 2019?



## **1.10. Definición de términos básicos**

### **Ejecución de proyectos de inversión**

La inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Consta de las 4 fases siguientes:

#### **Programación Multianual de Inversiones (PMI)**

Tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.

#### **Formulación y Evaluación (FyE)**

Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad.

#### **Ejecución**

Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

#### **Funcionamiento**

Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas, (Invierte.pe, 2016)

### **Reconocimiento a las Municipalidades**

Definiciones y términos básicos del Programa de Incentivo- PI premia el cumplimiento de metas de las municipalidades las cuales están asociadas a mejora en la calidad de los servicios públicos que se brinda a la población. En ese sentido, se otorgan dos tipos de reconocimiento:

#### **Los Incentivos Monetarios**

Son recursos que se otorgan de manera condicionada al cumplimiento de metas dentro de un periodo determinado. Todas las municipalidades del Perú pueden recibir estos recursos adicionales. Estos incentivos están conformados por; Las transferencias asociadas al cumplimiento de metas y Transferencias por concepto del Bono Adicional.

#### **Los incentivos no monetarios**

Es la recompensa que otorga el MEF a través del reconocimiento público a las municipalidades que cumplieron todas sus metas y que lograron estar ubicadas en los primeros tres (3) puestos de cada clasificación municipal. Este proceso se realiza a través de la elaboración de un Ranking de cumplimiento de metas del PI que se publica en el mes de abril, de manera previa a la transferencia de recursos.

#### **Bonos adicionales**

Los recursos del Bono Adicional son distribuidos únicamente entre aquellas municipalidades que cumplen todas las metas establecidas al 31 de diciembre de cada

año; dichos recursos están conformados por los montos no distribuidos a las municipalidades por el incumplimiento de metas y por la aplicación de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.

## **II. METODO**

### **2.1 Tipo y diseño de investigación**

#### **2.1.1. Tipos de investigación**

La investigación es de tipo cualitativa, se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones a la realidad y ambiente.

#### **2.1.2. Nivel de investigación**

La investigación es Descriptivo -correlacional, es crear una instantánea de la situación actual del proyecto de inversión y en cumplimiento de meta, asimismo, ayudará a comparar los datos o variables.

#### **2.1.3. Método y Diseño de investigación**

##### Método de investigación


El método que se utilizará en la investigación es el método de entrevista y análisis científico porque permitirá verificar los hechos en la ejecución de proyectos de inversión y cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en el gobierno local de Huanta.

La investigación podemos definirla como el proceso de llegar a soluciones fiables para

los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificadas y sistemáticas de los datos (Mouly, 1978).

#### 2.1.4. Diseño de investigación

El diseño del presente estudio de investigación corresponde a un tipo de Investigación cualitativo y el nivel de investigación descriptiva correlacional – causal trasversal y se grafica de la siguiente manera.



Dónde: n= Muestra de  
estudio  $O_x$ = Medición de  
la variable 1  $O_y$ =  
Medición de la variable  $\Rightarrow$

Donde la variable 1 influye en la variable 2

$$O_x \Rightarrow O_y \quad n$$

## 2.2 Población y muestra

### 2.2.1 Población

La población constituye los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huanta del área de Infraestructura y Gestión Territorio, Dirección de Planeamiento y Presupuesto, División de Formulación y Evaluación de Inversiones, Administración, Abastecimiento y

Patrimonio.

**Tabla 5** *Población que se tomará en cuenta para la investigación*

Descripción de la muestra	Total	Porcentaje
Gerencia de Infraestructura y Gestión Territorial	10	40%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	05	0.5%
División de Formulación y Evaluación de Inversiones	05	0.5%
Área de Abastecimiento y Patrimonio	10	40 %
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>100 %</b>

**Fuente:** Elaboración propia

### 2.2.2 Muestra

En la presente investigación se realizará entrevistas a los 26 funcionarios directamente responsables con la ejecución del proyecto de inversión y cumplimiento de metas en la municipalidad provincial de Huanta, en este caso es igual a 26 personas responsables, puesto que son funcionarios y trabajadores del estado de gobierno local.

$$n = \frac{N \cdot \sigma^2 \cdot Z^2}{E^2(N - 1) + \sigma^2 \cdot Z^2}$$

n = tamaño de la muestra

E = margen de error 0.05

N = población 26

Z = nivel de confianza 95%

$\sigma$  = desviación estándar 0.5

### **2.3 Técnicas para la recolección de Información**

La técnica de recolección de datos para la presente investigación será a través de la entrevista, durante la investigación realizaremos la entrevista a los funcionarios y trabajadores de las áreas responsables de la ejecución de proyectos de inversión y cumplimiento de metas del programa de incentivo en la Municipalidad provincial de Huanta 2019, porque ellos forman parte de la muestra, para obtener sus respuestas con relación a las variables ejecución de proyectos de inversión y cumplimiento de metas. Estas entrevistas serán de tipo auto administrado, para que los participantes de la investigación den sus respuestas en función a la percepción y experiencia que han palpado en las áreas durante la ejecución de proyectos y las causas de incumplimiento de la meta, para la presente entrevista se tomara en cuenta a los ítems de las variables en el presente estudio.

### **2.4 Validez del instrumento cualitativo**

Para el presente de trabajo de investigación utilizaremos los siguientes instrumentos:

- a) Cuestionarios de entrevista. Estos instrumentos contendrán preguntas de carácter cerrado utilizando escala de Likert sobre la ejecución de proyectos y cumplimiento de metas, utilizando la tabla de respuestas con las alternativas correspondientes.
- b) Fichas bibliográficas. Se utilizará los libros, revistas, páginas web y todas las fuentes donde se puede obtener información especializadas relacionados a la materia respectivamente a los variables que está planteado en este trabajo de investigación.
- c) Normas legas. Se revisará las normas legales, directivas de la ejecución de

proyectos y cumplimiento de metas en marco del programa de incentivo municipal.

#### **2.4.1 Validez de los instrumentos**

En la presente investigación, la validez del instrumento, será comprobado por los especialistas en las áreas relacionadas a los trabajos de investigación, los expertos de la facultad de ciencias de proyectos de inversión, empresarial y negocios de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática-UPCI

#### **2.4.2 Confiabilidad de los instrumentos**

Para la presente investigación se considera la aplicación de los cuestionarios estructuradas, el análisis de confiabilidad se hará mediante el enfoque de consistencia entre los ítems por el indicador alfa de cronbach, a través de ella se medirá si los ítems de la escalas están relacionadas entre sí, este procedimiento se realizó mediante estadístico SPSS, versión 26, análisis de la fiabilidad alfa, cuyo valor oscila entre 0 al 1, el resultado de 1 experiencia que existe consistencia ideal de los ítems.

Técnicas para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable solo a investigación en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, puedan codificarse como 1 o 0 (correcto – incorrecto, presente – ausente, a favor – en contra, etc.). la fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de n ítems o KR20 será:  $K = \frac{p}{n} \frac{St^2}{St^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2}$  donde: K= número de ítems del instrumento, p=personas que responden afirmativamente a cada ítem q=personas responden negativamente a cada ítem. St<sup>2</sup>= varianza del instrumento xi= puntaje total de cada encuestado, según (Olivero, 2016)

#### **2.5 Procesamiento y análisis de la información**

Para la presente investigación se realiza los procedimientos en cada etapa para la recolección y análisis de los datos, los procedimientos que se utilizara en la recolección de datos para la presente investigación serán aplicadas del uso de una técnica, que, a continuación, lo detallo:

### **2.5.1 Procesamiento**

La entrevista será auto administrada, para que los funcionarios que intervienen en presente investigación contesten las preguntas con las respuestas de acuerdo a la percepción y experiencia que tengan en cada uno de los ítems de las variables en estudio, estos serán procesados en una base de datos con el paquete estadístico SPSS.

### **2.5.2 Análisis de la información**

Para esta investigación se realizará el procesamiento de las informaciones mediante el paquete estadístico para ciencias sociales (IBM SPSS versión 26) con el cual se realizará los análisis estadísticos descriptiva, elaborando las tablas de distribución de frecuencias y gráficas, las mismas que se interpretará por medio de la frecuencias y porcentajes. El análisis estadístico inferencial establecerá mediante el método de correlación, las influencias de los indicadores de variables independiente, con la variable dependiente.

## **2.6 Aspectos éticos**

En esta investigación se tendrá en cuenta la ética de consentimiento informado, la ética permitirá que los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huanta, colaboren con el respectivo desarrollo de la entrevista de manera voluntaria y anonimato en los análisis. La seguridad será tipo biológico, psicológico, administrativo y social de los participantes durante el proceso de la investigación se mantendrá los procedimientos y el mecanismo para los participantes.

### III. RESULTADOS

#### 3.1 Resultados descriptivos

De acuerdo a la investigación realizada y con los datos recopilados, a continuación, mostramos los resultados obtenidos en el trabajo de sistemático y campo, con la finalidad de dar respuesta a nuestras interrogantes planteadas, para luego confirmar o rechazar nuestras hipótesis establecidas.

Los siguientes cuadros están formulados de acuerdo al orden de los objetivos específicos:

**Incluye: Sólo Proyectos**

Municipalidad	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
050401-300464: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	9,871,094	46,084,526	41,542,913	31,488,280	30,108,190	26,112,051	26,109,732	56.7
050402-300465: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	4,518,369	9,344,583	9,109,003	8,413,823	8,413,823	8,413,223	8,320,785	90.0
050403-300466: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA	497,656	7,027,197	6,213,573	5,993,031	5,993,031	5,993,031	5,992,784	85.3
050404-300467: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	268,208	5,478,972	5,117,279	5,048,236	5,019,246	5,012,415	5,002,083	91.5

IGUAIN									
050405-300468: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA	508,439	9,509,793	8,908,805	8,899,286	8,763,894	4,962,746	4,962,746	52.2	
050406-300469: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	581,817	11,641,483	10,168,119	6,706,995	3,389,077	3,389,077	3,387,939	29.1	
050407-300470: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA	5,045,743	14,623,676	14,329,067	12,611,052	12,308,519	9,911,906	9,911,906	67.8	
050408-301837: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	1,304,646	31,254,531	9,114,489	8,351,508	8,343,508	8,343,508	8,343,508	26.7	
050409-301850: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE	6,033,374	11,760,715	11,208,212	11,096,562	11,096,562	11,096,562	11,096,322	94.4	
050410-301862: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY	3,808,660	10,967,227	10,601,854	10,153,867	10,104,337	10,104,337	10,102,783	92.1	
050411-301866: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA	6,781,450	9,474,810	8,456,979	6,536,327	6,399,327	2,046,145	2,046,145	21.6	
050412-301874: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA	475,186	1,590,824	1,187,289	1,135,276	902,190	893,499	893,499	56.2	


Fuente:

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=Proye>

[cto](#)

Las Municipalidades Distritales de la provincia de Huanta, durante el año 2019, alcanzaron a ejecutar los proyectos de inversión y el cumplimiento meta, el resultado de ejecución que representa el porcentaje, para lo cual detallo en el gráfico siguiente:

**Figura 9** Avance de ejecución presupuestal 2019.

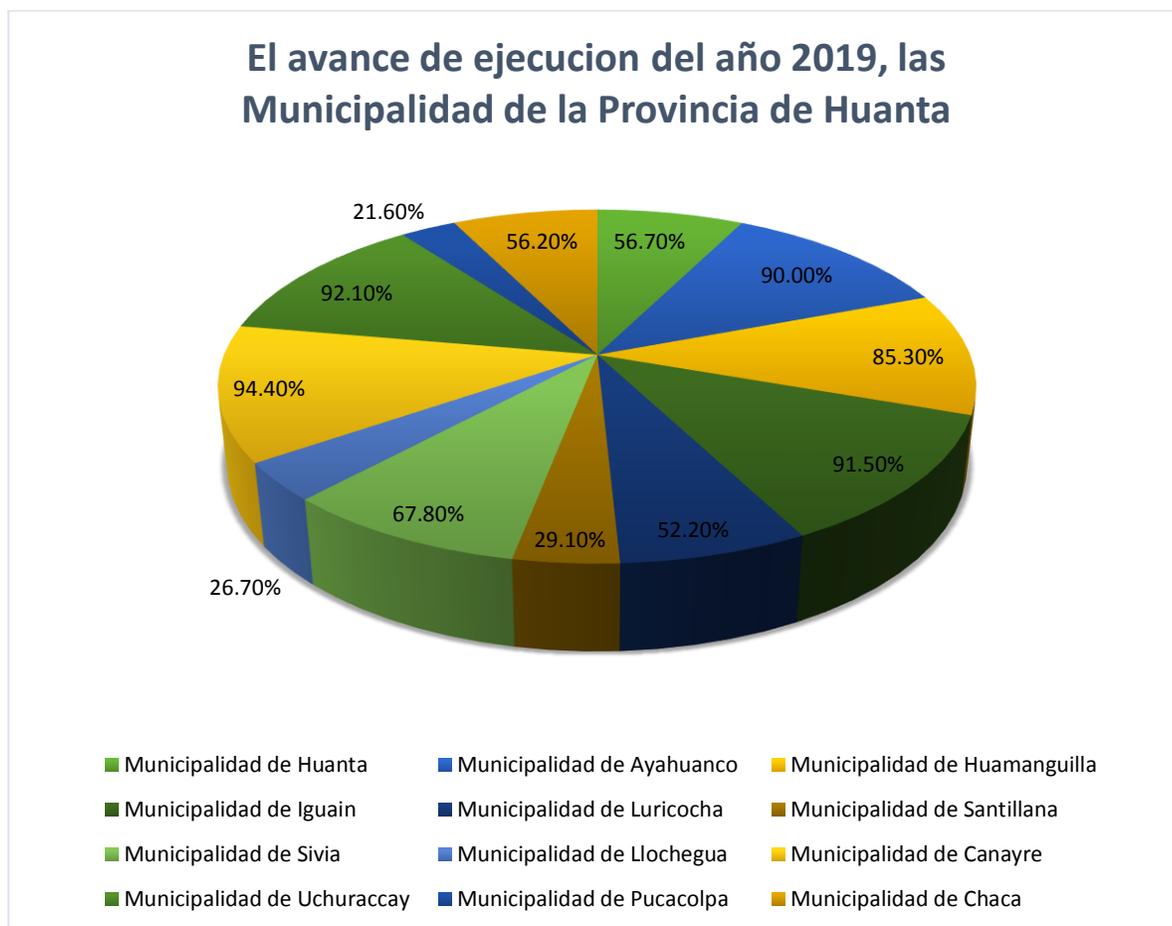

Fuente: elaboración propia

### Descriptivo

En la gráfica 1 se realizó el análisis de la ejecución de proyectos de inversión de los distritos de la provincia de Huanta, la Municipalidad Distrital de Huanta, programado en PIM, la S/. 46,084,526, logro ejecutar presupuestalmente la S/. 26,112,051, que representa al 56.7%, el resultado no ha sido favorable para la gestión, la Municipalidad distrital de Ayahuanco tenía en PIM. la S/. 9,344,583, ejecución presupuestalmente es la S/. 8,413,223, logrando el avance de ejecución al 90 %, la Municipalidad distrital de Huamanguilla, obtenida en PIM. la S/. 7,027,197, logrando ejecutar el presupuesto la S/. 5,993,031, el avance

porcentaje es 85.3%, la Municipalidad distrital de Iguain ha programado en PIM. la S/. 5,478,972, el avance de ejecución presupuestal es S/. 5,012,415, obteniendo el porcentaje al 91.5%, la Municipalidad Provincial de Luricocha, programo en su PIM. la S/. 9,509,793, ejecutando presupuestalmente la S/. 4,962,746, obteniendo el avance al 52.2%, resultados negativos para la gestión, la Municipalidad Distrital de Santillana, el PIM has sido programada la S/. 11,641,483, ejecutando presupuestalmente la S/. 3,389,077, obteniendo el avance de ejecución al 29.1%, resultado de la gestión negativo, la Municipalidad distrital de Sivia, programo en su PIM la S/. 14,623,676, ejecutando el presupuesto programado la S/. 9,911,906, en un avance al 67.8%, resultado es mayor al 50%, la Municipalidad Distrital de Llochegua, el presupuesto programado en PIM, la S/. 31,254,531, ejecutando el presupuesto programado la S/. 8,343,508, el porcentaje de ejecución que alcanzo al 26.7%, resultados negativos para la gestión, la Municipalidad Distrital de Canayre, programo el presupuesto en el PIM, la S/. 11,760,715, ejecutando el presupuesto en diferentes proyectos de inversión la S/. 11,096,562, el avance de ejecución refleja al 94.4%, resultados positivos en la ejecución más alto de todas las municipalidades, la Municipalidad Distrital de Uchuraccay ha programado en su PIM, la S/. 10,967,227, ejecutando el presupuesto programado la S/. 10,104,337, el avance de ejecución presupuestal al 92.1%, obteniendo resultados positivos en segundo lugar a nivel de los distritos de Huanta, la Municipalidad Distrital de Pucacolpa, programo en el PIM, la S/. 9,474,810, ejecutando el presupuesto programado la S/. 2,046,145, el porcentaje que ejecuto al 21.6%, resultado de la ejecución presupuestal negativo para la gestión municipal, ocupando el último lugar, por último, la Municipalidad Distrital de Chaca, programo el presupuesto en su PIM, la S/. 1,590,824, ejecutando el presupuesto la S/. 893,499, el avance de ejecución que representa al 56.2%, el resultado es mediamente positivo.

## PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION-PIM

**Tabla 6** *Proyectos de Inversion PMI 2019*

**Año de Ejecución: 2019**

**Incluye: Sólo Proyectos**

Municipalidad 050401-

300464:

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE


HUANTA

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Ejecución		Avance %
						Devengado	Girado	
	9,871,094	46,084,526	41,542,913	31,488,280	30,108,190	26,112,051	26,109,732	56.7

Fuente: Reporte MEF, consulta amigable

Elaboración propia

**Figura 10** *Programación multianual de inversión-PMI*

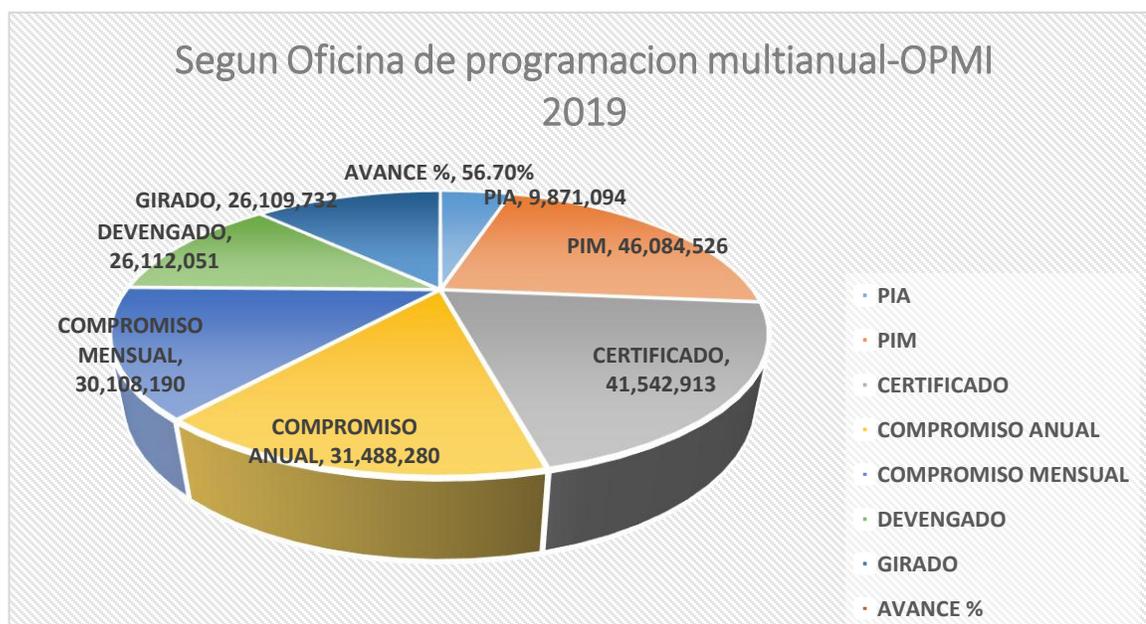

### Descripción

La tabla 2 y gráfico 2, presente la programación multianual de inversión-PMI, solo es proyectos de inversión de la Municipalidad Provincial de Huanta 2019, en la Programación Inicial de Apertura-PIA, es la S/. 9,871,094, en la Proyecto Inicial de

Modificado -PIM, en la S/.46,084,526, de los cuales la certificación es la S/. 41,542,913, el compromiso anual es la S/. 31,488,280, en el compromiso mensual es la S/.30,108,190, la ejecución de vengado es el monto S/. 26,112,051, el girado o pagado es la S/. 26,109,732, y el avance de ejecución de todos los proyectos de inversión presupuestalmente del PIM, logrando avanzar al 56.7% hasta 31 de diciembre del 2019.

### **EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

En este cuadro presentamos proyectos de inversión programados para el año 2019, cada proyecto tiene presupuestos asignados para su ejecución, asimismo, acuerdo al avance de ejecución ha sido evaluada para el cumplimiento de la meta 1 del Programa de Incentivo Municipal.



2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	200,000	5,006	0	0	0	0	0	0.0
2045164: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA	0	1,238,723	1,214,180	0	0	0	0	0.0
2143419: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	60,832	0	0	0	0	0	0.0
2144502: CONSTRUCCION DEL ESTADIO Y SEMBRADO DE GRASS EN LA COMUNIDAD DE VILLA FLORIDA, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0
2148884: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL PSJ. MONTONEROS Y JR. CESAR URBANO 1RA CUADRA EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	13,072	0	0	0	0	0	0.0
2148885: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL PSJ. GARCILAZO DE LA VEGA Y PSJ. CAHUIDE EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,173	0	0	0	0	0	0.0
2159404: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	18,962	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	79.1



2207613: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL BARRIO DE CASTROPAMPA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,620	0	0	0	0	0	0.0
2212253: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL PARQUE INFANTIL MORRO TUPIN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	200	200	200	200	200	200	100.0
2212969: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN ZONAS ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	732,499	750,497	750,495	677,982	677,982	677,982	677,264	90.3
2214488: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2214551: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE EDUCACION PRIMARIA N38262/MX-P CARMEN SOTO FLORES DEL CENTRO POBLADO DE UYUVIRCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2222659: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACA, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	126,701	120,049	115,246	115,246	115,246	115,246	91.0

2223313: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL DIVINO NIÑO JESUS EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0.0
2223698: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES CENTENARIO, ESPINAR, 22 DE JUNIO, PUNO, ZARUMILLA Y LIBERTAD EN LA CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	13,938	13,938	13,938	13,938	13,938	13,938	100.0
2234850: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN 15 PAGOS MARGEN DERECHA DEL RIO HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	1,647,092	1,635,418	1,436,745	1,436,745	1,436,745	1,436,745	87.2
2239058: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0.0
2240899: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUAYOCC ALTO, UYUVIRCA Y ESPIRITU SANTO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	8,448,122	8,448,121	2,851,362	2,851,362	2,802,612	2,802,612	33.2
2244598: INSTALACION DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	298,537	298,537	287,409	287,409	287,409	287,409	96.3

2250419: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DE LA I.E. ESMERALDA DE LOS ANDES DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	9,116	9,115	9,115	9,115	9,115	9,115	100.0
2251686: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LA I.E. 429-156MX-P, I.E.38268, I.E. 429-158MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE VISTA ALEGRE, SIVIA, CINTIARO EN LOS DISTRITOS DE SIVIA Y CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,783,320	7,781,433	7,713,320	7,642,150	7,642,150	7,642,150	98.2
2263261: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS ORIENTADO A LA NUEVA EXPANSION URBANA Y PERIURBANA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0
2264082: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL JR. ANTENOR ORREGO CDRA. 1 AL 3, PJE. J. DE LA RIVA AGÜERO, JR. VELANDO CDRA. 1 Y 2, PJE MIGUEL GRAU, JR. RICARDO PALMA CDRA. 1 Y 2, PJE. ORREGO, PJE. GARCILASO DE LA VEGA CDRA. 2 DEL BARRIO OCHO, DI	0	4,958	3,990	0	0	0	0	0.0
2267395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA EN LA RED VIAL VECINAL CANAYRE - CORONEL PORTILLO, JUNIN LIBERTAD - NUEVO PROGRESO - ROSARIO SANTILLANA - VIRGEN CCASA, EN LOS DISTRITOS DE LLOCHEGUA Y CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	6,811,285	6,810,572	6,810,572	6,810,572	2,863,183	2,863,183	42.0

2288272: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES, CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	518,111	518,109	493,665	493,665	493,665	493,665	95.3
2289539: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N 38881MX-U DE LA LOCALIDAD DE LLAQLLAN, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
2289930: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR. PUNO CDRA. 01; JR. 2 DE MAYO CDRA. 01 AL 07, JR. RICARDO URBANO CDRA 04; JR. MANCO CAPAC CDRA. 04, JR. FELIX IGUAIN CDRA. 04 DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA – AY	0	2,392,121	2,390,013	1,559,933	1,289,963	1,289,963	1,289,680	53.9
2307565: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0
2324579: CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO	0	362,790	362,789	296,584	296,584	296,584	296,584	81.8

2338421: RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCOC DISTRITO DE HUANTA Y LURIOCHA, PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO	0	990,000	958,101	861,870	840,720	840,720	840,720	84.9
2340601: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL – PATS	0	33,000	0	0	0	0	0	0.0
2369700: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA AVENIDA GERVASIO SANTILLANA CUADRA 1 Y 2, JIRON TARAPACA CUADRA 1 Y 2, Y EL PERIMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL DE HUANTA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAME	0	593,415	593,414	538,125	538,125	538,125	538,125	90.7
2369907: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MAESTRANZA DEL GARAJE MUNICIPAL EN EL SECTOR DE UYUVIRCA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	274,070	219,988	182,945	182,945	182,945	182,945	66.8
2370592: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 24 DE JUNIO 2DA CUADRA, JR. VICTOR RAUL YANGALI CASTRO CUADRA 1 Y 2, JR. LOS PROCERES, JR. HUGO MATTA TELLO 1ERA CUADRA Y PASAJE LA PAZ, DEL BARRIO HOSPITAL BAJA. HUANTA - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANT	0	33,503	33,503	25,127	25,127	25,127	25,127	75.0

2390297: CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	188,434	188,433	182,425	182,425	182,425	182,425	96.8
2390326: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE HUANZA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	242,631	242,631	234,737	234,737	234,737	234,737	96.7
2423285: ADQUISICION DE KITS O MATERIALES PARA EXPERIMENTOS DE BIOLOGIA; EN EL(LA) PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
2424104: ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	215,322	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	98.9
2428029: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IMPAO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	252,276	252,275	221,531	221,531	221,531	221,531	87.8

2429279: CONSTRUCCION DE AULA; EN EL(LA) IE 38254 LUIS CAVERO BENDEZU - HUANTA EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	23,879	23,052	23,052	23,052	23,052	23,052	96.5
2433514: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DE LA ALAMEDA MILTON CORDOVA LA TORRE DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	930	930	0	0	0	0	0.0
2434289: CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL PAGO DE CCACCAS DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	376,708	376,706	369,302	369,302	369,302	369,302	98.0
2434934: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE CRIANZA DE CUY EN LA ASOCIACION DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES DE CALLQUI BAJA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,500	100,000	59,747	59,747	59,747	59,747	54.6
2435077: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	109,000	94,444	94,444	94,444	94,444	86.6

2435154: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GANADO OVINO DE LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE CULLUCHACA EN EL SECTOR SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	108,998	59,348	59,348	59,348	59,348	54.4
2435311: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES POR LA VERDAD Y JUSTICIA EN LA COMUNIDAD DE MIO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	108,999	49,881	49,881	49,881	49,881	45.8
2437660: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV.GERVASIO SANTILLANA CUADRA 13 AL 16; AV. CARLOS LA TORRE CUADRA 1 AL 11,AV. CIRCUNVALACION ESTE CUADRA 2 A 4; JR. LUIS CAVERO CUADRA 3 Y 4, JR.VICTOR FAJARDO CUADRA 1 Y 2, JR. PEDRO	0	2,925,804	2,729,438	2,270,862	1,331,112	1,331,112	1,330,971	45.5
2445273: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	2,933,070	266,518	240,018	240,018	240,018	240,018	8.2
2450058: ADQUISICION DE ; EN EL(LA) INSUMO Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE PULGON Y TRIPS EN TARA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	80,000	80,000	70,605	70,605	70,605	70,605	88.3

2451686: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR.SALVADOR CAVERO CDRA 3, JR. MARIANO SOSA, JR. CHAVEZ GAVILAN CDRA 4 Y 5, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	1,027,246	1,027,244	1,004,314	992,414	992,414	992,414	96.6
2451890: RENOVACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) BCT LOS CABITOS N° 51 CASTROPAMPA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	97,342	97,341	0	0	0	0	0.0
2451891: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) ZONA DE CHANCARAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	91,557	91,557	85,039	85,039	85,039	85,039	92.9
2452344: RENOVACION DE ; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD MIO DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	45,729	4,800	0	0	0	0	0.0
2452419: ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	1,000,000	973,640	936,588	936,588	936,588	936,588	93.7

2453495: REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) VIAS URBANAS DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	190,000	190,000	179,369	179,369	179,369	178,192	94.4
2455012: RENOVACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	100,000	100,000	78,684	78,684	78,684	78,684	78.7
2457144: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE VIRU VIRU, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	149,265	149,264	121,156	121,156	121,156	121,156	81.2
2462550: CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) CHULA-RAZUHUILCA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	250,000	250,000	110,572	110,572	110,572	110,572	44.2
2466980: RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) ZONA PERI URBANA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	39,682	0	0	0	0	0	0.0
2472744: ADQUISICION DE GRUPOS DE INSTRUMENTOS; EN EL(LA) GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	10,845	0	0	0	0	0	0.0

Fuente:

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=Proyecto>

## **Descriptivo**

En la tabla 3, se refleja el análisis de ejecución de los proyectos de inversión de la Municipalidad Provincial de Huanta 2019, según la programación de multianual de inversiones-PMI, ha sido programado 75 proyectos de inversión para su ejecución durante el año 2019, en el Presupuesto Inicial de Apertura-PIA, ha sido programado la S/. 9,871,094, estos son presupuestos de FONCOMUN, durante el año 2019, posteriormente han sido gestionado otros presupuestos de diferentes ministerios del estado, todos esos presupuestos forman parte del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, asciende la S/. 46,084,526, obteniendo una gestión por resultado con una diferencia la S/. 36,213,432, calificando una buena gestión, de los cuales han sido certificado la S/. 41,542,913, para los diferentes proyectos que se encuentran en el cuadro arriba, igualmente el compromiso anual asciende la S/. 31,488,280, a continuación, se comprueba la atención compromiso mensual de ejecución presupuestal la S/. 30,108,190, el devengado es la ejecución presupuestal ya incluido el compromiso de pago, pero que aún todavía no ha sido pagado la S/. 26,112,051, asimismo, el presupuesto devengado ya se ejecutó, el girado (pagado) por diferentes bienes y servicios a los diferentes proveedores la S/. 26,109,732, al final se calcula con el PIM y devengado el porcentaje de ejecución presupuestal asciende la S/. 26,112,051, obteniendo al 56.7% de ejecución presupuestal del PIM. este análisis es en forma genérica sobre el presupuesto anual de la Municipalidad Provincial de Huanta, los detalles de la ejecución de presupuesto esta detallado en el cuadro arriba en mención de cada proyecto de inversión.

## **PROYECTOS SEGÚN EL AVANCE DE EJECUCION**

De los 75 proyectos de inversión programado en el PIA y PIM del año 2019, en marco del cumplimiento de meta 1 del PIM, Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto

Institucional Modificado, 12 proyectos han sido ejecutado al 100%, los 21 proyectos de inversión no han sido iniciado la ejecución físico ni financiero por tal se refleja el 0.0% en el avance de ejecución, esto habría sucedido por algunos modificaciones presupuestales o por cierre de proyectos, asimismo se ha analizado de 1 al 20% ha sido ejecutado 02 proyecto de inversión, del 21 al 40% 03 proyectos ha sido ejecutados, del 41 al 60% 08 proyectos han sido ejecutados, del 61 al 80% 04 proyectos ha sido ejecutado y del 81 al 99% 23 proyectos ha sido ejecutado

#### IV. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la ejecución de los proyectos de inversión de la Municipalidad Provincial de Huanta 2019. Para ello, se realizó un análisis con los datos proporcionados por la propia entidad en la oficina de programación de inversiones-OPMI, donde los resultados respondieron que en la *dimensión PIA* durante el año 2019, fue de 9,871,094, en la dimensión de Presupuesto Institucional Modificado-PIM, fue superado de 46,084,526, en la dimensión de certificación presupuestal ha sido de 41,542,913, mientras en compromiso anual obtuvo de 31,488,280, y los resultados en la ejecución financiera se obtuvo en la dimensión de devengado es de 26,112,051 y el girado de ejecución de 26,109,732, alcanzando en la ejecución de los proyectos de inversión a un porcentaje de 56.7% durante el año 2019, y el resultado del cumplimiento de la meta del programa de incentivo municipal se obtuvieron los resultados negativos por no superar al 80% en la “Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado”. Finalmente, en el porcentaje de ejecución se evidencia para el año 2019 fue de 56.7%, faltando de 43.3% para obtener al 100%, esto quiere decir ejecutar todos los proyectos de inversión para el cumplimiento de la meta 1, Presupuesto Institucional Modificado-PIM. Por tal razón la Municipalidad Provincial de Huanta no se ha considerado en el ranking de ejecución presupuestal, ni la transferencia presupuestal.

## V. CONCLUSIONES

Luego de haber finalizado la presente investigación en la **“Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”**, llegué a las siguientes conclusiones:

- 1.1. Está demostrado que el presupuesto de ejecución de los proyectos de inversión ha sido programado en el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, es la S/. 9,871,094 soles, en la dimensión de Presupuesto Institucional Modificado-PIM, acumulando saldos de balance como las gestiones realizadas ha sido obtenido la S/ 46,084,526 soles para el periodo del 2019.
- 1.2. Si bien cierto en el Presupuesto Institucional Modificado-PIM, ha sido obtenido por gestiones de los sectores asciende a la S/ 46,084,526 soles para el periodo del 2019. de los cuales, la S/. 41,542,913 soles, realizaron la certificación presupuestal de acuerdo a la priorización de la ejecución de diferentes proyectos de inversión durante el año 2019, mientras el compromiso anual obtuvo la S/. 31,488,280, los resultados de la ejecución financiera se obtuvieron en la dimensión de devengado es de 26,112,051 y el girado de ejecución de 26,109,732, alcanzando en la ejecución de los proyectos de inversión a un porcentaje de 56.7% durante el año 2019.
- 1.3. En relación al nivel de cumplimiento de la meta 1 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, programadas en términos de eficacia son menores de lo

esperado y al valor nominal de unidad, a juicio por la cual el logro de objetivos institucionales es negativo en la Municipalidad Provincial de Huanta, debido a que el indicador de eficacia de ejecución con respecto ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el año fiscal 2019 es de 56.7%, mostrando un menor grado de ejecución de ingresos de manera global, así como a nivel de fuentes de financiamiento y genérica en el rubro de inversión en el año 2019; mientras en otras municipalidades han superado a mayor 80% en la ejecución de los proyectos de inversión, obteniendo resultados positivos y logrando un premio dineraria acuerdo al ranking de resultados de evaluación.

1.4. Mediante la entrevista realizada a las áreas responsables que dirigen y realizan la ejecución de proyectos de inversión y presupuestaria se logró identificar los factores que inciden negativamente en la ejecución de proyectos de inversión por tanto la ejecución presupuestaria también refleja negativamente, como son los casos de: Deficiente programación para la ejecución de los proyectos de inversión, la falta de compromiso de las algunas unidades de la municipalidad, pero también se identificó las dificultades en los procesos administrativos como las tardía licitaciones de las obras en contrata, por otro lado casi los últimos trimestres transferencia presupuestaria de parte del gobierno nacional para algunas obras públicas. Asimismo, los sistemas informáticos como son; el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF, El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (**Invierte.pe**), son sistemas que realizan el seguimiento de la ejecución física y financiera, por falta personal capacitado no ha sido eficiente seguimiento.

## **VI. RECOMENDACIONES**

Planteo las siguientes recomendaciones a fin de que logre una eficiente ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión y así cumplir las metas del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en los próximos periodos en la Municipalidad Provincial de Huanta.

1.5. En cuanto la priorización de ejecución de los proyectos de inversión, planteo que debe realizar adecuada programación de los presupuestos de inversión, por lo que los planes operativos institucionales, haciendo una diagnostico situacional real, para realizar con el presupuesto estimado, destinando los recursos de manera razonable, los plazos establecidos deben cumplir en la misma fecha, para el cumplimiento de las metas y objetivos para alcanzar los resultados positivos dentro del periodo.

1.6. La Municipalidad Provincial de Huanta, cuenta con la Oficina de Programación de Multianual de Inversiones-OPMI, esta división debe ser la promotora de realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión con eficiente y eficacias en coordinación con las áreas responsables como; la división de Formulación y Evaluación de las Inversiones, división de Supervisión y Liquidación de Obras y Oficina de Administración y Finanzas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bazar & Pinedo. (2019). *Planificación en la Oficina de Presupuesto y su relación con la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2016.*

Tarapoto: Creativecommons.org. Obtenido de <http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/3446>

Calcina. (2019). *Los Proyectos del Sector Social en la Fase de Ejecución en el Presupuesto Publica, del Gobierno Autónomo Municipal de El Ato 2001-2017.* La Paz:

Universidad Mayor de San Andrés. Obtenido de <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/22355>

Cerdan. (2011). Análisis de la capacidad de gestión local y administración de recursos económicos en proyectos de inversión social de la Federación de Nacionalidades Kichwas del Napo, Especialización en Desarrollo Local y Territorio;. *FLACSO Sede Ecuador. Quito*, 129 p.

Chilón. (2016). *Capacidad de Ejecución del Gasto Publico de los Proyectos de Inversión en la Municipalidad Provincial de Huagayoc-Bambamarca durante los primeros tres años de gestión: 2007-2009 y 2011 - 2013.* Universidad Nacional de Cajamarca: Cajamarca.

Choquehuanca y Chávez. (2019). *Plan de incentivos y su incidencia en la calidad de gasto público de la Municipalidad Distrital de Soritor - periodo 2015 - 2016.* Tarapoto: Universidad Nacional de San Martín.

Clemente. (2016). *Ejecución de proyectos de inversión y desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Perú.* Huancavelica: Chimera Software.

Congreso Republica. (2004). *Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto*. Lima: Diario el Peruano. Obtenido de [http://transparencia.mtc.gob.pe/idm\\_docs/normas\\_legales/1\\_0\\_31](http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_31).

Congreso Republica. (2009). *Ley N° 29332, Ley que cre el plan de incentivo a la mejora de la gestión municipal*. Lima: MEF.

Directiva 002. (2019). *DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA-EF*. Lima: Diario el Peruano.

Fernández\_Chaiña. (2019). *Análisis y Evaluación de la Ejecución presupuestaria y los cumplimientos de metas de la Municipalidad Provincial de El Collao- Ilave periodos 2016-2017*. Puno: Universidad Nacional del Antepalano-Puno.

Invierte.pe. (2016). *Decreto Legislativo N° 1252, Créase el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado*. Lima: Diario el Peruano. Obtenido de <https://www.mef.gob.pe/es/acerca-del-invierte-pe>

Ley N°. 30879. (2018). *LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019*. Lima: Editorial Perú-El Peruano.

Mamani. (2017). *Gestión Administrativa de los recursos y el Cumplimiento del Programa Incentivo Municipal del Distrito de Potoni. Azángaro, periodo 2013-2015*. Moquegua: UJCM.

Olivero. (30 de Set. de 2016). *Técnicas de confiabilidad y validez de los instrumentos de las mediciones controlar cualquier posible sesgo*. Guayaquil: DIPA. Obtenido de <https://es.slideshare.net/ug-dipa/capitulo-3-confiabilidad-y-validez-de-los-instrumentos#:~:text=CONFIABILIDAD%20S>

Ramírez. (2018). *Programa de Incentivos en La Municipalidad distrital de San Juan de*

*Lurigancho*2017. Lima: CHIMERA SOFTWARE S.A.C.

Romero R., C. (2016). *Análisis de la Ejecución de la Inversión Pública y Incidencia de la calidad vida de la población*. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.

Romero, A. (2015). Baja ejecución presupuestaria en inversión pública en los gobiernos municipales de Bolivia. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 207. Obtenido de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/15/inversion.html>

Valarzo, Delgado y Vérez. (2016). *Estudio de factibilidad en el sistema de dirección por proyectos de inversión*. La Habana: Ingeniería Industrial.

Velásquez Guevara, R. C. (2019). *Incidencia de la ejecución de proyectos de inversión pública en el crecimiento económico de las regiones del Perú, período 2007 - 2017*. Lima-Perú: Unitru.edu.pe.

# ANEXOS

## Anexo 1. Matriz de consistencia

**Título: Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”**

<b>PROBLEMA</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>HIPOTISIS</b>	<b>VARIABLES</b>	<b>METODOLOGÍA</b>
<p><b>Problema general</b></p> <p>¿Cuáles el nivel de “Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”?</p>	<p><b>Objetivo general</b></p> <p>Establecer el nivel de “Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”.</p>	<p><b>Hipótesis general</b></p> <p>Existe significativamente el nivel de “Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019”.</p>	<p><b>Variable 1</b> Ejecución de proyectos de inversión</p> <p><b>Dimensión</b> *Presupuesto Institucional Anual-PIA *Presupuesto Institucional Modificado-PIM *Compromiso Anual *Devengado</p>	<p><b>Enfoque</b> Cualitativo</p> <p><b>Alcance:</b> Descriptivo y correlacional</p> <p><b>Diseño:</b> No experimental y transversal</p>
<p><b>Problemas específicos</b></p> <p>¿Cuáles el nivel de ejecución de los proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019? ¿Cuáles el nivel de cumplimiento de la meta del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019? ¿Cuáles la relación que existe entre la ejecución de proyectos de inversión y cumplimiento metas del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019?</p>	<p><b>Objetivos específicos</b></p> <p>Establecer el nivel ejecución de los proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019. Establecer la relación que existe entre el nivel de ejecución de los proyectos y el cumplimiento de metas del programa incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019. Construir la capacidad de ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo municipal de la Municipalidad Provincial de Huanta 2029</p>	<p><b>Hipótesis específicas</b></p> <p>Existe el nivel de ejecución de proyectos de inversión en la Municipalidad provincial de Huanta, 2019. Existen la relación entre el nivel de ejecución de proyectos y el cumplimiento de la meta del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Existe la relación y la capacidad en el nivel de ejecución de proyecto de inversión y el cumplimiento de meta en el marco del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019.</p>	<p><b>Variable 2</b> Cumplimiento de metas del PIM 2019.</p> <p><b>Dimensión</b> *Metas asignadas por el MEF. *Ejecución de presupuesto. *Calidad de ejecución de los proyectos. *Seguimiento de los proyectos de inversión, formato 12B, *Diagnosticode cierre de inversiones y registro formato 9.</p>	<p><b>Población:</b> Los funcionarios y trabajadores de la gerencia de infraestructura, planeamiento y presupuesto, Administración y logística</p> <p><b>Técnica de recolección de datos</b> *Análisis documental *Entrevista</p> <p><b>Instrumento para la recolección de datos</b> Cuestionario de encuesta, 2 por cada variable.</p>

## Anexo 2. instrumento de recolección de datos

**Formulario de encuesta:** a continuación, vamos a proponer una serie de preguntas relacionado a la ejecución de proyectos de inversión pública y el cumplimiento de la meta en marco del programa de incentivos en la Municipalidad Provincial de Huanta 2019. Este cuestionario forma parte de una investigación, nos interesa conocer tu opinión.

**Introducción:** lee cuidadosamente el enunciado de cada pregunta y los asigne la respuesta que correspondiente, con las palabras claves “si, no o con sus propios palabras” que puede considerar en algunas preguntas.

### 1. DATOS GENERALES DEL FUNCIONARIO

1.1. Sexo	Varón		Mujer		
1.2. Edad					
1.3. Área laboral					
1.4. Profesión					

<b>Variable 1: Ejecución de los proyectos de inversión</b>		
Ítems	Descripción de preguntas	Respuesta abierta
1	¿En la elaboración de Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, participan todos los funcionarios y directivos?	
2	¿Porque no se cumple en su totalidad la ejecución del PIA?	
3	¿A qué se debe permanente modificación presupuestal-PIM?.	

4	¿Las normas de ejecución de proyectos de inversión y presupuesto son favorables?	
5	¿Cuáles la principal deficiencia en la ejecución de presupuestal?	
6	¿A qué se debe el bajo nivel de ejecución de los proyectos de inversión?	
7	¿Por qué no se puede realizar el compromiso anual en su totalidad?	
8	¿Cuál de las modalidades de ejecución de los proyectos es más dificultoso? ¿Administración directa o contrata?	
9	El devengado es el avance de ejecución de presupuesto, según tu opinión ¿Por qué no se puede devengar al igual que el compromiso?	
10	Según tu opinión ¿Cuál sería la alternativa de eficiente ejecución de proyectos, y logra un avance más de 85% anual?	
<b>Variable 2: Cumplimiento de meta 1, en marco del PIM</b>		
Ítems	Descripción de preguntas	Respuesta abierta
1	Mef asigna meta 1; Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado, según tu opinión ¿es bueno o no y porqué?	
2	¿Es importante el Cumplimiento de meta del PIM 2019?, sí o no ¿Por qué?	

3	¿Ejecución de presupuesto para cumplir la meta se ha cumplido en 2019? Si o no ¿Por qué?	
4	Los proyectos programados en el PMI, es favorable para el cumplimiento de la meta 1 2019?	
5	¿El cronograma de ejecución de proyectos cumple en su totalidad? Si o no ¿Por qué?	
6	¿Es conveniente el avance de cumplimiento de metas en la ejecución de proyectos por trimestral?	
7	¿Cuáles son las dificultades para no cumplir la meta de la ejecución de proyectos de inversión a más de 85% anual?	
8	¿El seguimiento a la ejecución, diagnóstico de cierre y registro de cierre de inversiones, ayuda a la ejecución de presupuestal?	
9	¿En qué área o unidad de la municipalidad demoran más los documentos administrativos?	
10	¿En el periodo 2019, a cuanto % llegaron la ejecución de los proyectos de inversión?	

### Anexo 3. Base de datos

Base de datos 1: avance de ejecución los distritos de la provincia de Huanta 2019

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?		
	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre	Mes		
TOTAL				30,677,994,511	48,849,915,450	42,482,363,967	36,926,133,333	32,770,252,930	31,745,293,988	31,681,263,263	65.0
Nivel de Gobierno M. GOBIERNOS LOCALES				8,044,689,164	20,207,332,254	17,640,925,006	14,259,892,094	12,513,800,650	12,022,225,415	11,993,368,756	59.5
Gov. Loc./Mancom. M. MUNICIPALIDADES				8,044,689,164	20,202,886,763	17,640,593,062	14,259,573,149	12,513,481,705	12,021,918,271	11,993,061,611	59.5
Departamento 05 AYACUCHO				255,412,889	992,904,672	886,310,897	778,742,236	715,234,659	679,526,254	678,642,867	68.4
Provincia 0504: HUANTA				39,694,642	168,758,337	135,957,581	116,434,243	110,841,703	96,278,499	96,170,232	57.1

Municipalidad	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
050401-300464: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	9,871,094	46,084,526	41,542,913	31,488,280	30,108,190	26,112,051	26,109,732	56.7
050402-300465: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	4,518,369	9,344,583	9,109,003	8,413,823	8,413,823	8,413,223	8,320,785	90.0
050403-300466: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA	497,656	7,027,197	6,213,573	5,993,031	5,993,031	5,993,031	5,992,784	85.3
050404-300467: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN	268,208	5,478,972	5,117,279	5,048,236	5,019,246	5,012,415	5,002,083	91.5
050405-300468: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA	508,439	9,509,793	8,908,805	8,899,286	8,763,894	4,962,746	4,962,746	52.2
050406-300469: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	581,817	11,641,483	10,168,119	6,706,995	3,389,077	3,389,077	3,387,939	29.1
050407-300470: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA	5,045,743	14,623,676	14,329,067	12,611,052	12,308,519	9,911,906	9,911,906	67.8
050408-301837: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	1,304,646	31,254,531	9,114,489	8,351,508	8,343,508	8,343,508	8,343,508	26.7
050409-301850: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE	6,033,374	11,760,715	11,208,212	11,096,562	11,096,562	11,096,562	11,096,322	94.4
050410-301862: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY	3,808,660	10,967,227	10,601,854	10,153,867	10,104,337	10,104,337	10,102,783	92.1
050411-301868: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA	6,781,450	9,474,810	8,458,979	6,536,327	6,399,327	2,046,145	2,046,145	21.6
050412-301874: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA	475,186	1,590,824	1,187,289	1,135,276	902,190	893,499	893,499	56.2

Base de datos 2: Categoría presupuestal de PIA y PIM

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
Nivel de Gobierno M. GOBIERNOS LOCALES	8,044,689,164	20,207,332,254	17,640,925,006	14,259,892,094	12,513,800,650	12,022,225,415	11,993,368,756	59.5
Gov. Loc./Mancom. M. MUNICIPALIDADES	8,044,689,164	20,202,886,763	17,640,593,062	14,259,573,149	12,513,481,705	12,021,918,271	11,993,061,611	59.5
Departamento 05 AYACUCHO	255,412,889	992,904,672	886,310,897	778,742,236	715,234,659	679,526,254	678,642,867	68.4
Provincia 0504: HUANTA	39,694,642	168,758,337	135,957,581	116,434,243	110,841,703	96,278,499	96,170,232	57.1
Municipalidad 050401-300464: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	9,871,094	46,084,526	41,542,913	31,488,280	30,108,190	26,112,051	26,109,732	56.7

Buscar ítem	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	2,952,032	281,518	255,018	255,018	255,018	255,018	8.6
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	990,000	1,990,000	1,931,740	1,798,458	1,777,308	1,777,308	1,777,308	89.3
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	0	436,500	426,997	263,420	263,420	263,420	263,420	60.3
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	90,000	93,500	93,500	84,105	84,105	84,105	84,105	90.0
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	0	1,796,357	1,784,682	1,557,901	1,557,901	1,557,901	1,557,901	86.7
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0	1,490,999	1,486,455	221,531	221,531	221,531	221,531	14.9
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,046,150	9,682,706	8,694,354	3,091,587	3,091,587	3,042,836	3,042,836	31.4
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3,199,479	61,379	26,552	26,552	26,552	26,552	26,552	43.3
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0	7,792,436	7,790,549	7,722,435	7,651,266	7,651,266	7,651,266	98.2
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0	739,498	739,495	665,886	665,886	665,886	665,886	90.0
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	930	930	0	0	0	0	0.0
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,000,000	13,158,322	12,845,522	11,329,129	10,119,409	6,172,020	6,171,596	48.9
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	0	1,101,036	1,039,234	1,012,314	1,000,414	1,000,414	1,000,414	90.9
9001: ACCIONES CENTRALES	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,545,465	4,783,831	4,416,384	3,458,444	3,392,294	3,392,294	3,390,399	70.9



<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 219363: CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE CHOLA VALDIVIA, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	130,624	114,696	47,683	47,683	47,683	47,683	36.5	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 220573: CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CHIHUA, DISTRITO DE IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2207613: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL BARRIO DE CASTROPAMPA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,620	0	0	0	0	0	0.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2212253: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL PARQUE INFANTIL MORRO TUPIN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	200	200	200	200	200	200	100.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2212969: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN ZONAS ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	732,499	750,497	750,495	677,982	677,982	677,982	677,264	90.3	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2214488: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2214551: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE EDUCACION PRIMARIA N°38262M.P. CARMEN SOTO FLORES DEL CENTRO POBLADO DE UYUVIRCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2222859: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACA, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	126,701	120,049	115,246	115,246	115,246	115,246	91.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2223313: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL DIVINO NIÑO JESUS EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2223698: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES CENTENARIO, ESPINAR, 22 DE JUNIO, PUÑO, ZARUMILLA Y LIBERTAD EN LA CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	13,938	13,938	13,938	13,938	13,938	13,938	100.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2234850: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN 15 PAGOS MARGEN DERECHA DEL RIO HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	1,647,092	1,635,418	1,436,745	1,436,745	1,436,745	1,436,745	87.2	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2239058: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0.0	
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>									
○ 2240899: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUAYOCC ALTO, UYUVIRCA Y ESPIRITU SANTO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	8,448,122	8,448,121	2,851,362	2,851,362	2,802,612	2,802,612	33.2	

<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2244598: INSTALACION DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	298,537	298,537	287,409	287,409	287,409	287,409	96.3
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2250419: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DE LA I.E. ESMERALDA DE LOS ANDES DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	9,116	9,115	9,115	9,115	9,115	9,115	100.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2251888: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LA I.E. 429-158MX-P I E 38268 I.E. 429-158MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE VISTA ALEGRE, SIVIA, CINTIARO EN LOS DISTRITOS DE SIVIA Y CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	7,783,320	7,781,433	7,713,320	7,642,150	7,642,150	7,642,150	98.2
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2263261: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS ORIENTADO A LA NUEVA EXPANSION URBANA Y PERIURBANA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2264082: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL JR. ANTONOR ORREGO CDRA. 1 AL 3 PJE. J. DE LA RIVA AGÜERO, JR. VELANDO CDRA. 1 Y 2, PJE. MIGUEL GRAU, JR. RICARDO PALMA CDRA. 1 Y 2, PJE. ORREGO, PJE. GARCILASO DE LA VEGA CDRA. 2 DEL BARRIO OCHO, DI	0	4,958	3,990	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2267395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA EN LA RED VIAL VECINAL CANAYRE - CORONEL PORTILLO, JUNIN LIBERTAD - NUEVO PROGRESO - ROSARIO SANTILLANA - VIRGEN CCASA, EN LOS DISTRITOS DE LLOCHEGUA Y CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	6,811,285	6,810,572	6,810,572	6,810,572	2,863,183	2,863,183	42.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2288272: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES, CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	518,111	518,109	493,665	493,665	493,665	493,665	95.3
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2289539: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N 38881MX-U DE LA LOCALIDAD DE LLAOLLAN, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2289930: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR. PUÑO CDRA. 01, JR. 2 DE MAYO CDRA. 01 AL 07, JR. RICARDO URBANO CDRA. 04, JR. MANCO CAPAC CDRA. 04, JR. FELIX IGUAIN CDRA. 04 DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AY	0	2,392,121	2,390,013	1,559,933	1,289,963	1,289,963	1,289,680	53.9
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2307565: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2324579: CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	362,790	362,789	296,584	296,584	296,584	296,584	81.8
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>								
○ 2338421: RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOC DISTRITO DE HUANTA Y LURIOCHA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	0	990,000	958,101	861,870	840,720	840,720	840,720	84.9

<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2340601: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS	0	33,000	0	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2369700: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA AVENIDA GERVASIO SANTILLANA CUADRA 1 Y 2, JIRON TARAPACA CUADRA 1 Y 2, Y EL PERIMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL DE HUANTA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAME	0	593,415	593,414	538,125	538,125	538,125	538,125	90.7
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2369907: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MAESTRANZA DEL GARAJE MUNICIPAL EN EL SECTOR DE UYUVIRCA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	274,070	219,988	182,945	182,945	182,945	182,945	66.8
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2370592: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 24 DE JUNIO 2DA CUADRA JR. VICTOR RAUL YANGALI CASTRO CUADRA 1 Y 2, JR. LOS PROCERES, JR. HUGO MATTA TELLO 1ERA CUADRA Y PASAJE LA PAZ, DEL BARRIO HOSPITAL BAJA, HUANTA - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANT	0	33,503	33,503	25,127	25,127	25,127	25,127	75.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2390297: CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLOUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	188,434	188,433	182,425	182,425	182,425	182,425	96.8
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2390329: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE HUANZA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	242,631	242,631	234,737	234,737	234,737	234,737	96.7
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2423285: ADQUISICION DE KITS O MATERIALES PARA EXPERIMENTOS DE BIOLOGIA; EN EL(LA) PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2424104: ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIELALCIDES CARRION - HUANTA EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	215,322	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	98.9
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2428029: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IMPAO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	252,276	252,275	221,531	221,531	221,531	221,531	87.8
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2429279: CONSTRUCCION DE AULA, EN EL(LA) IE 36254 LUIS CAVERO BENDEZU - HUANTA EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	23,879	23,052	23,052	23,052	23,052	23,052	96.5
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2433514: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DE LA ALAMEDA MILTON CORDOVA LA TORRE DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	930	930	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2434289: CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL PAGO DE CCACCAS DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	376,708	376,706	369,302	369,302	369,302	369,302	98.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2434934: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE CRIANZA DE CUY EN LA ASOCIACION DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES DE CALLOUI BAJA DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,500	100,000	59,747	59,747	59,747	59,747	54.6
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2435077: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	109,000	94,444	94,444	94,444	94,444	86.6
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2435154: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GANADO OVINO DE LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE CULLUCHACA EN EL SECTOR SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	108,998	59,348	59,348	59,348	59,348	54.4
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2435311: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES POR LA VERDAD Y JUSTICIA EN LA COMUNIDAD DE MIO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	109,000	108,999	49,881	49,881	49,881	49,881	45.8
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2437660: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV GERVASIO SANTILLANA CUADRA 13 AL 16, AV CARLOS LA TORRE CUADRA 1 AL 11, AV. CIRCUNVALACION ESTE CUADRA 2 A 4, JR. LUIS CAVERO CUADRA 3 Y 4, JR VICTOR FAJARDO CUADRA 1 Y 2, JR. PEDRO	0	2,925,804	2,729,438	2,270,862	1,331,112	1,331,112	1,330,971	45.5
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2445273: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	2,933,070	266,518	240,018	240,018	240,018	240,018	8.2
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2450058: ADQUISICION DE, EN EL(LA) INSUMO Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE PULGON Y TRIPS EN TARA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	80,000	80,000	70,605	70,605	70,605	70,605	88.3
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2451686: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR SALVADOR CAVERO CDRA 3, JR. MARIANO SOSA, JR. CHAVEZ GAVILAN CDRA 4 Y 5, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	1,027,246	1,027,244	1,004,314	992,414	992,414	992,414	96.6
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2451890: RENOVACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR, EN EL(LA) BCT LOS CABITOS N° 51 CASTROPAMPA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	97,342	97,341	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2451891: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL(LA) ZONA DE CHANCARAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	91,557	91,557	85,039	85,039	85,039	85,039	92.9
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2452344: RENOVACION DE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD MIO DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	45,729	4,800	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2452419: ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, EN EL(LA) PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	1,000,000	973,640	936,588	936,588	936,588	936,588	93.7
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2453495: REPARACION DE PAVIMENTO, EN EL(LA) VIAS URBANAS DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	190,000	190,000	179,369	179,369	179,369	178,192	94.4
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2455012: RENOVACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, EN EL(LA) LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	100,000	100,000	78,684	78,684	78,684	78,684	78.7
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2457144: REPARACION DE CANAL DE RIEGO, EN EL(LA) LOCALIDAD DE VIRU VIRU, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	149,265	149,264	121,156	121,156	121,156	121,156	81.2
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2462550: CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL(LA) CHULA-RAZUHUILLCA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	250,000	250,000	110,572	110,572	110,572	110,572	44.2
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2468980: RENOVACION DE VIAS DE ACCESO, EN EL(LA) ZONA PERI URBANA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	39,682	0	0	0	0	0	0.0
<a href="#">Ficha de Proyecto</a>	○	2472744: ADQUISICION DE GRUPOS DE INSTRUMENTOS, EN EL(LA) GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	0	10,845	0	0	0	0	0	0.0

**Notas**

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 17 de mayo de 2022.

Sobre la información presentada | Estadísticas de uso

Anexo 4. Evidencias de similitud digital

Ejecución de los proyectos de  
inversión y el cumplimiento de  
metas en el marco del  
programa de incentivo en la  
municipalidad provincial de  
**Huanta 2019**  
*por Huamán Quispe Paulino*

## Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019

### INFORME DE ORIGINALIDAD



### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>repositorio.unap.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>www.mef.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>www4.congreso.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repositorio.ucv.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>hdl.handle.net</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>blog.pucp.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>doc.contraloria.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universidad Cesar Vallejo</b> Trabajo del estudiante	<b>1%</b>

9	<a href="http://repositorio.umsa.bo">repositorio.umsa.bo</a> Fuente de Internet	1 %
10	<a href="http://www.grin.com">www.grin.com</a> Fuente de Internet	1 %
11	<a href="http://repositorio.upci.edu.pe">repositorio.upci.edu.pe</a> Fuente de Internet	1 %
12	<a href="http://www.elperulegal.com">www.elperulegal.com</a> Fuente de Internet	1 %
13	<a href="http://transparenciahuanta.blogspot.com">transparenciahuanta.blogspot.com</a> Fuente de Internet	1 %
14	<a href="http://dspace.unitru.edu.pe">dspace.unitru.edu.pe</a> Fuente de Internet	1 %
15	<a href="http://conosce.osce.gob.pe">conosce.osce.gob.pe</a> Fuente de Internet	1 %
16	<a href="http://busquedas.elperuano.pe">busquedas.elperuano.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
17	<a href="http://dataonline.gacetajuridica.com.pe">dataonline.gacetajuridica.com.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
18	<a href="http://distancia.udh.edu.pe">distancia.udh.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
19	<a href="http://ogpl.unmsm.edu.pe">ogpl.unmsm.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
20	<a href="http://www.regionayacucho.gob.pe">www.regionayacucho.gob.pe</a> Fuente de Internet	<1 %

---

21	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1 %
22	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
23	Submitted to Universidad Católica San Pablo Trabajo del estudiante	<1 %
24	munihuanta.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
25	Submitted to Universidad Catolica De Cuenca Trabajo del estudiante	<1 %
26	repositorio.unc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	crhc.ana.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
28	Submitted to Universidad del Istmo de Panamá Trabajo del estudiante	<1 %
29	Submitted to Universidad Inca Garcilaso de la Vega Trabajo del estudiante	<1 %
30	Submitted to Universidad Peruana de Ciencias e Informatica Trabajo del estudiante	<1 %
31	munipnuevochincha.gob.pe Fuente de Internet	<1 %

---

32	Submitted to Universidad de Málaga - Tii Trabajo del estudiante	<1 %
33	Submitted to Universidad Técnica de Machala Trabajo del estudiante	<1 %
34	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
35	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	<1 %
36	www.perulicitaciones.com Fuente de Internet	<1 %
37	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
38	vsip.info Fuente de Internet	<1 %
39	idoc.pub Fuente de Internet	<1 %
40	repositorio.udh.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas      Activo

Excluir bibliografía      Activo

Excluir coincidencias      < 20 words

## Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE  
TRABAJO DE INVESTIGACION O TESIS  
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UPCI**

**1.- DATOS DEL AUTOR**

Apellidos y Nombres: HUAMAN QUISPE PAULINO  
 DNI: 80098259 Correo electrónico: phuamang25@gmail.com  
 Domicilio: CP. UCHURACCAY.  
 Teléfono fijo: — Teléfono celular: 966158102

**2.- IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO o TESIS**

Facultad/Escuela: CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS  
 Tipo: Trabajo de Investigación Bachiller () Tesis ()  
 Título del Trabajo de Investigación / Tesis:  
"Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019"

**3.- OBTENER:**

Bachiller () Título () Mg () Dr () PhD ()

**4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN VERSIÓN ELECTRÓNICA**

Por la presente declaro que el (trabajo/tesis) Tesis indicada en el ítem 2 es de mi autoría y exclusiva titularidad, ante tal razón autorizo a la Universidad Peruana Ciencia e Informática para publicar la versión electrónica en su Repositorio Institucional (<http://repositorio.upci.edu.pe>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art 23 y Art. 33.

Autorizo la publicación (marque con una X):

Sí, autorizo el depósito total.


Sí, autorizo el depósito y solo las partes: \_\_\_\_\_

No autorizo el depósito.

Como constancia firmo el presente documento en la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de

Abril

de 2023.

  
Firma

Huella digital



## Anexo 6. Juicio de expertos

**FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO**



**DATOS GENERALES:**

Apellidos y Nombre del Informante: *2010 Yvies Yacuelo*  
 Institución donde labora: *Municipalidad Provincial de Huanta*  
 Nombre del Instrumento que motiva la evaluación: *GUÍA DE ENTREVISTA*  
 Tesis: "Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019"  
 Autor del Instrumento: *BACH. HUAMÁN QUISPE, PAULINO*

**II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:**

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
METODOLOGÍA	Considera que los ítems miden lo que el investigador pretende medir				80%	
COHERENCIA	Considera que los ítems utilizados son propios del campo que se está investigando					95%
CONSISTENCIA	Existe consistencia entre los indicadores y los ítems				80%	
ORGANIZACIÓN	Considera Organizado el desarrollo del Marco Teórico					90%
CLARIDAD	La investigación está desarrollada en un lenguaje apropiado				80%	
OPERACIONALIZACIÓN	Presenta operacionalizados sus variables e indicadores					90%
ESTRATEGIAS	Considera adecuado los Métodos estadísticos para contrastar las hipótesis					95%
ACTUALIDAD	Presenta Actualizados actualizados hasta con tres años de antigüedad					90%

**III. OPINIÓN PARA APLICAR EL INSTRUMENTO:**


Qué aspectos se tienen que Modificar, aumentar o suprimir en los Instrumentos de Investigación:

Guía de entrevista estructural propuesta por el Bachiller contiene los elementos a medir en la Operacionalización de la variable de estudio.

**IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:**

Hecho las revisiones correspondientes a la tesis en mención, esta obtiene una puntuación promedio de 87.5%.

Lima, 25 de mayo del 2022



Firma del Experto Informante  
 DNI: *40913467* Telf./Cel.: *987893428*

## FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO



### I. DATOS GENERALES:

Apellidos y Nombre del Informante: *RUCIFORTA GONZALES DIERCELA*  
 Institución donde labora: *MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA*  
 Nombre del Instrumento que motiva la evaluación: *GUÍA DE ENTREVISTA*  
 Tesis: "Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019"  
 Autor del Instrumento: *BACH. HUAMÁN QUISPE, PAULINO*

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
METODOLOGÍA	Considera que los ítems miden lo que el investigador pretende medir				80%	
COHERENCIA	Considera que los ítems utilizados son propios del campo que se está investigando					95%
CONSISTENCIA	Existe Consistencia entre los indicadores y los ítems				80%	
ORGANIZACIÓN	Considera Organizado el desarrollo del Marco Teórico					90%
CLARIDAD	La investigación está desarrollada en un lenguaje apropiado				80%	
OPERACIONALIZACIÓN	Presenta operacionalizadas sus variables e indicadores					100%
ESTRATEGIAS	Considera adecuado los Métodos estadísticos para contrastar las hipótesis				80%	
ACTUALIDAD	Presenta Antecedentes actualizados hasta con tres años de antigüedad				80%	

### III. OPINIÓN PARA APLICAR EL INSTRUMENTO:

Qué aspectos se tienen que Modificar, aumentar o suprimir en los Instrumentos de Investigación:

Guía de entrevista estructura propuesta por el Bachiller contiene los elementos a medir en la Operacionalización de la variable de estudio.

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Hecho las revisiones correspondientes a la tesis en mención, esta obtiene una puntuación promedio de 85.625%.

Lima, 25 de mayo del 2022

Firma del Experto Informante  
 DNI: 44381332 Telf./Cel: 972513842

## FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO



### I. DATOS GENERALES:

Apellidos y Nombre del Informante: *Naupa Galvez Palagio*  
 Institución donde labora: *Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma*  
 Nombre del Instrumento que motiva la evaluación: *GUÍA DE ENTREVISTA*  
 Tesis: "Ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento de metas en el marco del programa de incentivo en la municipalidad provincial de Huanta 2019"  
 Autor del Instrumento: *BACH. HUAMÁN QUISPE, PAULINO*

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
METODOLOGÍA	Considera que los ítems miden lo que el investigador pretende medir					85%
COHERENCIA	Considera que los ítems utilizados son propios del campo que se está investigando					95%
CONSISTENCIA	Existe Consistencia entre los indicadores y los ítems				80%	
ORGANIZACIÓN	Considera Organizado el desarrollo del Marco Teórico					90%
CLARIDAD	La investigación está desarrollada en un lenguaje apropiado				80%	
OPERACIONALIZACIÓN	Presenta operacionalizadas sus variables e indicadores					90%
ESTRATEGIAS	Considera adecuado los Métodos estadísticos para contrastar las hipótesis				80%	
ACTUALIDAD	Presenta Antecedentes actualizados hasta con tres años de antigüedad				80%	

### III. OPINIÓN PARA APLICAR EL INSTRUMENTO:

Qué aspectos se tienen que Modificar, aumentar o suprimir en los Instrumentos de Investigación:

Guía de entrevista estructura propuesta por el Bachiller contienen los elementos a medir en la Operacionalización de la variable de estudio.

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Hecho las revisiones correspondientes a la tesis en mención, esta obtiene una puntuación promedio de 85,00%.

Lima, 25 de mayo del 2022

Firma del Experto Informante  
 DNI: *28603456* Telf./Cel.: *999850949*
